












































Id		Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
0			<b>DAU v3 08_04_2015</b>	<b>1%</b>	<b>222 días</b>	<b>mar 23/12/14</b>	<b>vie 30/10/15</b>
1			<b>Migración DEAJ</b>	<b>62%</b>	<b>28.38 días</b>	<b>mar 23/12/14</b>	<b>mar 03/02/15</b>
2			<b>Organización Información</b>	<b>62%</b>	<b>28.38 días</b>	<b>mar 23/12/14</b>	<b>mar 03/02/15</b>
3			<b>Recepcion Información</b>	<b>70%</b>	<b>12 días</b>	<b>mar 23/12/14</b>	<b>vie 09/01/15</b>
4			Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	95%	6 días	mar 23/12/14	jue 01/01/15
5			Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	95%	6 días	mar 23/12/14	jue 01/01/15
6			Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	mar 23/12/14	jue 01/01/15
7			Analisis y organizacion informacion	90%	6 días	vie 02/01/15	vie 09/01/15
8			<b>Organizacion Migración</b>	<b>85%</b>	<b>1.38 días</b>	<b>lun 12/01/15</b>	<b>mar 13/01/15</b>
9			Aprobación creación de nuevos nombres usuario, equipos y servidores.	80%	1 día	lun 12/01/15	lun 12/01/15
10			Selección cuentas y equipos por migrar, y estrategias	100%	3 hrs	mar 13/01/15	mar 13/01/15
11			<b>Realización Migración Usuarios y Computadores</b>	<b>65%</b>	<b>11 días</b>	<b>mar 13/01/15</b>	<b>mié 28/01/15</b>
12			Primer piso	54%	1 día	mar 13/01/15	mié 14/01/15
13			Mezanine	65%	1 día	mié 14/01/15	jue 15/01/15
14			Segundo piso	86%	1 día	jue 15/01/15	vie 16/01/15
15			Tercer piso	68%	1 día	vie 16/01/15	lun 19/01/15
16			Cuarto piso	17%	1 día	lun 19/01/15	mar 20/01/15
17			Quinto piso	94%	1 día	mar 20/01/15	mié 21/01/15
18			Sexto piso	39%	1 día	mié 21/01/15	jue 22/01/15
19			Septimo piso	82%	1 día	jue 22/01/15	vie 23/01/15
20			Octavo piso	79%	1 día	vie 23/01/15	lun 26/01/15
21			Noveno piso	83%	1 día	lun 26/01/15	mar 27/01/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
22		Decimo piso	50%	1 día	mar 27/01/15	mié 28/01/15
23		<b>Realización Migración de Servidores</b>	<b>0%</b>	<b>4 días</b>	<b>mié 28/01/15</b>	<b>mar 03/02/15</b>
24		Migracion servidores	0%	4 días	mié 28/01/15	mar 03/02/15
25		<b>DEAJ MIGRADA</b>	0%	0 días	mar 03/02/15	mar 03/02/15
26		<b>Migración Riohacha</b>	<b>0%</b>	<b>28 días</b>	<b>lun 20/04/15</b>	<b>mié 27/05/15</b>
27		<b>Organización Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 20/04/15</b>	<b>mié 29/04/15</b>
28		<b>Recepcion Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 20/04/15</b>	<b>mié 29/04/15</b>
29		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15
30		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15
31		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15
32		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	mar 28/04/15	mié 29/04/15
33		<b>Configuración Prerequisitos</b>	<b>0%</b>	<b>23 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>mié 27/05/15</b>
34		<b>Configuración Controlador de dominio rama judicial</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>lun 27/04/15</b>
35		Verificación instalación Sistema Operativo	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
36		Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
37		Instalación admt V32	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
38		<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
39		<b>Tareas dominio CSJ</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
40		<b>Creación relación de confianza</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>lun 27/04/15</b>
41		Creacion zonas stub DNS dominio Riohacha, dirjud	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
42		Creación relacion confianza	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
43		<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Riohacha</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 28/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
44		Asignación y creación de grupos dominio Riohacha	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
45		Instalación PES en el controlador de Riohacha	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
46		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
47		<b>Realizacion de pruebas</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 28/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
48		<b>Uso de herramienta de migración</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 28/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
49		Creación de grupos test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
50		Creacion usuarios test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
51		Creación computadores test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
52		Creación servidores test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
53		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
54		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
55		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
56		<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	<b>0%</b>	<b>15 días</b>	<b>mié 29/04/15</b>	<b>mar 19/05/15</b>
57		Migrar Usuarios	0%	15 días	mié 29/04/15	mar 19/05/15
58		Migrar Computadores	0%	15 días	mié 29/04/15	mar 19/05/15
59		<b>Migración Servidores</b>	<b>0%</b>	<b>6 días</b>	<b>mié 20/05/15</b>	<b>mié 27/05/15</b>
60		Migracion servidores	0%	6 días	mié 20/05/15	mié 27/05/15
61		<b>RIOHACHA MIGRADA</b>	0%	0 días	mié 27/05/15	mié 27/05/15
62		<b>Migración Sincelejo</b>	<b>3%</b>	<b>38 días</b>	<b>lun 20/04/15</b>	<b>mié 10/06/15</b>
63		<b>Organización Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 20/04/15</b>	<b>mié 29/04/15</b>
64		<b>Recepcion Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 20/04/15</b>	<b>mié 29/04/15</b>
65		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15
66		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15
67		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
68		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	mar 28/04/15	mié 29/04/15
69		<b>Configuración Prerequisitos</b>	<b>4%</b>	<b>33 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>mié 10/06/15</b>
70		<b>Configuración Controlador de dominio rama judicial</b>	<b>87%</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>lun 27/04/15</b>
71		Verificación instalación Sistema Operativo	100%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
72		Promoción a controlador de dominio	80%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
73		Instalación admt V32	80%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
74		<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
75		<b>Tareas dominio CSJ</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
76		<b>Creación relación de confianza</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>lun 27/04/15</b>
77		Creacion zonas stub DNS dominio Sincelejo, dirjud	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
78		Creación relacion confianza	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
79		<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Sincelejo</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 28/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
80		Asignación y creación de grupos dominio Sincelejo	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
81		Instalación PES en el controlador de Sincelejo	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
82		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
83		<b>Realizacion de pruebas</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 28/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
84		<b>Uso de herramienta de migración</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 28/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
85		Creación de grupos test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
86		Creacion usuarios test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
87		Creación computadores test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
88		Creación servidores test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
89		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
90		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
91		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
92		<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	<b>0%</b>	<b>25 días</b>	<b>mié 29/04/15</b>	<b>mar 02/06/15</b>
93		Migrar Usuarios	0%	25 días	mié 29/04/15	mar 02/06/15
94		Migrar Computadores	0%	25 días	mié 29/04/15	mar 02/06/15
95		<b>Migración Servidores</b>	<b>0%</b>	<b>6 días</b>	<b>mié 03/06/15</b>	<b>mié 10/06/15</b>
96		Migracion servidores	0%	6 días	mié 03/06/15	mié 10/06/15
97		<b>SINCELEJO MIGRADA</b>	0%	0 días	mié 10/06/15	mié 10/06/15
98		<b>Migración Valledupar</b>	<b>1%</b>	<b>36 días</b>	<b>lun 20/04/15</b>	<b>lun 08/06/15</b>
99		<b>Organización Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 20/04/15</b>	<b>mié 29/04/15</b>
105		<b>Configuración Prerequisitos</b>	<b>1%</b>	<b>31 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>lun 08/06/15</b>
106		<b>Configuración Controlador de dominio rama judicial</b>	<b>33%</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>lun 27/04/15</b>
107		Verificación instalación Sistema Operativo	100%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
108		Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
109		Instalación admt V32	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
110		<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
111		<b>Tareas dominio CSJ</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
112		<b>Creación relación de confianza</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>lun 27/04/15</b>
113		Creacion zonas stub DNS dominio Valledupar, dirjud	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
114		Creación relacion confianza	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
115		<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Valledupar</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 28/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
116		Asignación y creación de grupos dominio Valledupar	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
117		Instalación PES en el controlador de Valledupar	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
118		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15


























Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			




















Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
119		<b>Realizacion de pruebas</b>	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
120		<b>Uso de herramienta de migración</b>	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
121		Creación de grupos test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
122		Creacion usuarios test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
123		Creación computadores test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
124		Creación servidores test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
125		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
126		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
127		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
128		<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	0%	23 días	mié 29/04/15	vie 29/05/15
129		Migrar Usuarios	0%	23 días	mié 29/04/15	vie 29/05/15
130		Migrar Computadores	0%	23 días	mié 29/04/15	vie 29/05/15
131		<b>Migración Servidores</b>	0%	6 días	lun 01/06/15	lun 08/06/15
132		Migracion servidores	0%	6 días	lun 01/06/15	lun 08/06/15
133		<b>VALLEDUPAR MIGRADA</b>	0%	0 días	lun 08/06/15	lun 08/06/15
134		<b>Migración Popayan</b>	3%	43 días	jue 28/05/15	lun 27/07/15
135		<b>Organización Información</b>	0%	8 días	jue 28/05/15	lun 08/06/15
136		<b>Recepcion Información</b>	0%	8 días	jue 28/05/15	lun 08/06/15
137		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15
138		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15
139		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15
140		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	vie 05/06/15	lun 08/06/15
141		<b>Configuración Prerequisitos</b>	3%	38 días	jue 04/06/15	lun 27/07/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id		Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
142			<b>Configuracion Controlador de dominio rama judicial</b>	<b>87%</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>jue 04/06/15</b>
143			Verificación instalación Sistema Operativo	100%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
144			Promoción a controlador de dominio	80%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
145			Instalación admt V32	80%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
146			<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
147			<b>Tareas dominio CSJ</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
148			<b>Creación relación de confianza</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>jue 04/06/15</b>
149			Creacion zonas stub DNS dominio Popayan, dirjud	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
150			Creación relacion confianza	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
151			<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Popayan</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 05/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
152			Asignación y creación de grupos dominio Popayan	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
153			Instalación PES en el controlador de Popayan	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
154			Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
155			<b>Realizacion de pruebas</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 05/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
156			<b>Uso de herramienta de migración</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 05/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
157			Creación de grupos test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
158			Creacion usuarios test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
159			Creación computadores test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
160			Creación servidores test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
161			Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
162			Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
163			Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
164			<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	<b>0%</b>	<b>30 días</b>	<b>lun 08/06/15</b>	<b>vie 17/07/15</b>

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
165		Migrar Usuarios	0%	30 días	lun 08/06/15	vie 17/07/15
166		Migrar Computadores	0%	30 días	lun 08/06/15	vie 17/07/15
167		<b>Migración Servidores</b>	<b>0%</b>	<b>6 días</b>	<b>lun 20/07/15</b>	<b>lun 27/07/15</b>
168		Migracion servidores	0%	6 días	lun 20/07/15	lun 27/07/15
169		<b>POPAYAN MIGRADA</b>	0%	0 días	lun 27/07/15	lun 27/07/15
170		<b>Migración Pereira</b>	<b>2%</b>	<b>45 días</b>	<b>lun 20/04/15</b>	<b>vie 19/06/15</b>
171		<b>Organización Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 20/04/15</b>	<b>mié 29/04/15</b>
172		<b>Recepcion Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 20/04/15</b>	<b>mié 29/04/15</b>
173		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15
174		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15
175		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15
176		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	mar 28/04/15	mié 29/04/15
177		<b>Configuración Prerequisitos</b>	<b>3%</b>	<b>40 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>vie 19/06/15</b>
178		<b>Configuración Controlador de dominio rama judicial</b>	<b>87%</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>lun 27/04/15</b>
179		Verificación instalación Sistema Operativo	100%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
180		Promoción a controlador de dominio	80%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
181		Instalación admt V32	80%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
182		<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
183		<b>Tareas dominio CSJ</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
184		<b>Creación relación de confianza</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>lun 27/04/15</b>
185		Creacion zonas stub DNS dominio Pereira, dirjud	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
186		Creación relacion confianza	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
187		<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Pereira</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 28/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
188		Asignación y creación de grupos dominio Pereira	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
189		Instalación PES en el controlador de Pereira	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
190		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
191		<b>Realizacion de pruebas</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 28/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
192		<b>Uso de herramienta de migración</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 28/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
193		Creación de grupos test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
194		Creacion usuarios test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
195		Creación computadores test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
196		Creación servidores test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
197		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
198		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
199		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
200		<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	<b>0%</b>	<b>32 días</b>	<b>mié 29/04/15</b>	<b>jue 11/06/15</b>
201		Migrar Usuarios	0%	32 días	mié 29/04/15	jue 11/06/15
202		Migrar Computadores	0%	32 días	mié 29/04/15	jue 11/06/15
203		<b>Migración Servidores</b>	<b>0%</b>	<b>6 días</b>	<b>vie 12/06/15</b>	<b>vie 19/06/15</b>
204		Migracion servidores	0%	6 días	vie 12/06/15	vie 19/06/15
205		<b>Pereira MIGRADA</b>	0%	0 días	vie 19/06/15	vie 19/06/15
206		<b>Migración Armenia</b>	<b>2%</b>	<b>52 días</b>	<b>lun 20/04/15</b>	<b>mar 30/06/15</b>
207		<b>Organización Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 20/04/15</b>	<b>mié 29/04/15</b>
208		<b>Recepcion Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 20/04/15</b>	<b>mié 29/04/15</b>
209		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15
210		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
211		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15
212		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	mar 28/04/15	mié 29/04/15
213		<b>Configuración Prerequisitos</b>	<b>3%</b>	<b>47 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>mar 30/06/15</b>
214		<b>Configuracion Controlador de dominio rama judicial</b>	<b>87%</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>lun 27/04/15</b>
215		Verificación instalación Sistema Operativo	100%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
216		Promoción a controlador de dominio	80%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
217		Instalación admt V32	80%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
218		<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
219		<b>Tareas dominio CSJ</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
220		<b>Creación relación de confianza</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>lun 27/04/15</b>
221		Creacion zonas stub DNS dominio Armenia, dirjud	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
222		Creación relacion confianza	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
223		<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Armenia</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 28/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
224		Asignación y creación de grupos dominio Armenia	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
225		Instalación PES en el controlador de Armenia	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
226		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
227		<b>Realizacion de pruebas</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 28/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
228		<b>Uso de herramienta de migración</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 28/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
229		Creación de grupos test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
230		Creacion usuarios test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
231		Creación computadores test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
232		Creación servidores test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
233		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
234		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
235		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
236		<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	<b>0%</b>	<b>39 días</b>	<b>mié 29/04/15</b>	<b>lun 22/06/15</b>
237		Migrar Usuarios	0%	39 días	mié 29/04/15	lun 22/06/15
238		Migrar Computadores	0%	39 días	mié 29/04/15	lun 22/06/15
239		<b>Migración Servidores</b>	<b>0%</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 23/06/15</b>	<b>mar 30/06/15</b>
240		Migracion servidores	0%	6 días	mar 23/06/15	mar 30/06/15
241		<b>ARMENIA MIGRADA</b>	0%	0 días	mar 30/06/15	mar 30/06/15
242		<b>Migración Santa Marta</b>	<b>2%</b>	<b>52 días</b>	<b>lun 20/04/15</b>	<b>mar 30/06/15</b>
243		<b>Organización Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 20/04/15</b>	<b>mié 29/04/15</b>
244		<b>Recepcion Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 20/04/15</b>	<b>mié 29/04/15</b>
245		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15
246		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15
247		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15
248		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	mar 28/04/15	mié 29/04/15
249		<b>Configuración Prerequisitos</b>	<b>2%</b>	<b>47 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>mar 30/06/15</b>
250		<b>Configuración Controlador de dominio rama judicial</b>	<b>60%</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>lun 27/04/15</b>
251		Verificación instalación Sistema Operativo	100%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
252		Promoción a controlador de dominio	80%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
253		Instalación admt V32	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
254		<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
255		<b>Tareas dominio CSJ</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
256		<b>Creación relación de confianza</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 27/04/15</b>	<b>lun 27/04/15</b>

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
257		Creacion zonas stub DNS dominio Santa Marta, dirjud	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
258		Creación relacion confianza	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
259		<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Santa Marta</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 28/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
260		Asignación y creación de grupos dominio Santa Marta	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
261		Instalación PES en el controlador de Santa Marta	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
262		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
263		<b>Realizacion de pruebas</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 28/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
264		<b>Uso de herramienta de migración</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 28/04/15</b>	<b>mar 28/04/15</b>
265		Creación de grupos test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
266		Creacion usuarios test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
267		Creación computadores test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
268		Creación servidores test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
269		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
270		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
271		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
272		<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	<b>0%</b>	<b>39 días</b>	<b>mié 29/04/15</b>	<b>lun 22/06/15</b>
273		Migrar Usuarios	0%	39 días	mié 29/04/15	lun 22/06/15
274		Migrar Computadores	0%	39 días	mié 29/04/15	lun 22/06/15
275		<b>Migración Servidores</b>	<b>0%</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 23/06/15</b>	<b>mar 30/06/15</b>
276		Migracion servidores	0%	6 días	mar 23/06/15	mar 30/06/15
277		<b>SANTA MARTA MIGRADA</b>	0%	0 días	mar 30/06/15	mar 30/06/15
278		<b>Migración Villavicencio</b>	<b>2%</b>	<b>52 días</b>	<b>mar 09/06/15</b>	<b>mié 19/08/15</b>
279		<b>Organización Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>mar 09/06/15</b>	<b>jue 18/06/15</b>

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
280		<b>Recepcion Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>mar 09/06/15</b>	<b>jue 18/06/15</b>
281		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	mar 09/06/15	mar 16/06/15
282		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	mar 09/06/15	mar 16/06/15
283		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	mar 09/06/15	mar 16/06/15
284		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	mié 17/06/15	jue 18/06/15
285		<b>Configuración Prerequisitos</b>	<b>3%</b>	<b>47 días</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>mié 19/08/15</b>
286		<b>Configuracion Controlador de dominio rama judicial</b>	<b>87%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>mar 16/06/15</b>
287		Verificación instalación Sistema Operativo	100%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
288		Promoción a controlador de dominio	80%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
289		Instalación admt V32	80%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
290		<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>mié 17/06/15</b>
291		<b>Tareas dominio CSJ</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>mié 17/06/15</b>
292		<b>Creación relación de confianza</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>mar 16/06/15</b>
293		Creacion zonas stub DNS dominio Villavicencio, dirjud	0%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
294		Creación relacion confianza	0%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
295		<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Villavicencio</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 17/06/15</b>	<b>mié 17/06/15</b>
296		Asignación y creación de grupos dominio Villavicencio	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
297		Instalación PES en el controlador de Villavicencio	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
298		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
299		<b>Realizacion de pruebas</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 17/06/15</b>	<b>mié 17/06/15</b>
300		<b>Uso de herramienta de migración</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 17/06/15</b>	<b>mié 17/06/15</b>
301		Creación de grupos test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
302		Creacion usuarios test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
303		Creación computadores test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
304		Creación servidores test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
305		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
306		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
307		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
308		<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	<b>0%</b>	<b>39 días</b>	<b>jue 18/06/15</b>	<b>mar 11/08/15</b>
309		Migrar Usuarios	0%	39 días	jue 18/06/15	mar 11/08/15
310		Migrar Computadores	0%	39 días	jue 18/06/15	mar 11/08/15
311		<b>Migración Servidores</b>	<b>0%</b>	<b>6 días</b>	<b>mié 12/08/15</b>	<b>mié 19/08/15</b>
312		Migracion servidores	0%	6 días	mié 12/08/15	mié 19/08/15
313		<b>VILLAVICENCIO MIGRADA</b>	0%	0 días	mié 19/08/15	mié 19/08/15
314		<b>Migracion Pasto</b>	<b>0%</b>	<b>53 días</b>	<b>jue 11/06/15</b>	<b>lun 24/08/15</b>
315		<b>Organización Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>jue 11/06/15</b>	<b>lun 22/06/15</b>
316		<b>Recepcion Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>jue 11/06/15</b>	<b>lun 22/06/15</b>
317		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	jue 11/06/15	jue 18/06/15
318		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	jue 11/06/15	jue 18/06/15
319		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	jue 11/06/15	jue 18/06/15
320		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	vie 19/06/15	lun 22/06/15
321		<b>Configuración Prerequisitos</b>	<b>0%</b>	<b>48 días</b>	<b>jue 18/06/15</b>	<b>lun 24/08/15</b>
322		<b>Configuración Controlador de dominio rama judicial</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 18/06/15</b>	<b>jue 18/06/15</b>
323		Verificación instalación Sistema Operativo	0%	1 día	jue 18/06/15	jue 18/06/15
324		Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	jue 18/06/15	jue 18/06/15
325		Instalación admt V32	0%	1 día	jue 18/06/15	jue 18/06/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
326		<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	0%	2 días	jue 18/06/15	vie 19/06/15
327		<b>Tareas dominio CSJ</b>	0%	2 días	jue 18/06/15	vie 19/06/15
328		<b>Creación relación de confianza</b>	0%	1 día	jue 18/06/15	jue 18/06/15
329		Creacion zonas stub DNS dominio Pasto, dirjud	0%	1 día	jue 18/06/15	jue 18/06/15
330		Creación relacion confianza	0%	1 día	jue 18/06/15	jue 18/06/15
331		<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Pasto</b>	0%	1 día	vie 19/06/15	vie 19/06/15
332		Asignación y creación de grupos dominio Pasto	0%	1 día	vie 19/06/15	vie 19/06/15
333		Instalación PES en el controlador de Pasto	0%	1 día	vie 19/06/15	vie 19/06/15
334		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	vie 19/06/15	vie 19/06/15
335		<b>Realizacion de pruebas</b>	0%	1 día	vie 19/06/15	vie 19/06/15
336		<b>Uso de herramienta de migración</b>	0%	1 día	vie 19/06/15	vie 19/06/15
337		Creación de grupos test	0%	1 día	vie 19/06/15	vie 19/06/15
338		Creacion usuarios test	0%	1 día	vie 19/06/15	vie 19/06/15
339		Creación computadores test	0%	1 día	vie 19/06/15	vie 19/06/15
340		Creación servidores test	0%	1 día	vie 19/06/15	vie 19/06/15
341		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	vie 19/06/15	vie 19/06/15
342		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	vie 19/06/15	vie 19/06/15
343		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	vie 19/06/15	vie 19/06/15
344		<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	0%	40 días	lun 22/06/15	vie 14/08/15
345		Migrar Usuarios	0%	40 días	lun 22/06/15	vie 14/08/15
346		Migrar Computadores	0%	40 días	lun 22/06/15	vie 14/08/15
347		<b>Migración Servidores</b>	0%	6 días	lun 17/08/15	lun 24/08/15
348		Migracion servidores	0%	6 días	lun 17/08/15	lun 24/08/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
349		<b>PASTO MIGRADA</b>	0%	0 días	lun 24/08/15	lun 24/08/15
350		<b>Migracion Cucuta</b>	0%	63 días	jue 28/05/15	lun 24/08/15
351		<b>Organización Información</b>	0%	8 días	jue 28/05/15	lun 08/06/15
352		<b>Recepcion Información</b>	0%	8 días	jue 28/05/15	lun 08/06/15
353		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15
354		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15
355		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15
356		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	vie 05/06/15	lun 08/06/15
357		<b>Configuración Prerequisitos</b>	0%	58 días	jue 04/06/15	lun 24/08/15
358		<b>Configuración Controlador de dominio rama judicial</b>	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
359		Verificación instalación Sistema Operativo	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
360		Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
361		Instalación admt V32	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
362		<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	0%	2 días	jue 04/06/15	vie 05/06/15
363		<b>Tareas dominio CSJ</b>	0%	2 días	jue 04/06/15	vie 05/06/15
364		<b>Creación relación de confianza</b>	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
365		Creacion zonas stub DNS dominio Cucuta, dirjud	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
366		Creación relacion confianza	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
367		<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Riohacha</b>	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
368		Asignación y creación de grupos dominio Cucuta	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
369		Instalación PES en el controlador de Cucuta	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
370		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
371		<b>Realizacion de pruebas</b>	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
372		<b>Uso de herramienta de migración</b>	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
373		Creación de grupos test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
374		Creacion usuarios test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
375		Creación computadores test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
376		Creación servidores test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
377		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
378		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
379		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
380		<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	0%	50 días	lun 08/06/15	vie 14/08/15
381		Migrar Usuarios	0%	50 días	lun 08/06/15	vie 14/08/15
382		Migrar Computadores	0%	50 días	lun 08/06/15	vie 14/08/15
383		<b>Migración Servidores</b>	0%	6 días	lun 17/08/15	lun 24/08/15
384		Migracion servidores	0%	6 días	lun 17/08/15	lun 24/08/15
385		<b>CUCUTA MIGRADA</b>	0%	0 días	lun 24/08/15	lun 24/08/15
386		<b>Migracion Neiva</b>	0%	63 días	jue 28/05/15	lun 24/08/15
387		<b>Organización Información</b>	0%	8 días	jue 28/05/15	lun 08/06/15
388		<b>Recepcion Información</b>	0%	8 días	jue 28/05/15	lun 08/06/15
389		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15
390		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15
391		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15
392		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	vie 05/06/15	lun 08/06/15
393		<b>Configuración Prerequisitos</b>	0%	58 días	jue 04/06/15	lun 24/08/15
394		<b>Configuracion Controlador de dominio rama judicial</b>	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
395		Verificación instalación Sistema Operativo	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
396		Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
397		Instalación admt V32	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
398		<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
399		<b>Tareas dominio CSJ</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
400		<b>Creación relación de confianza</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>jue 04/06/15</b>
401		Creacion zonas stub DNS dominio Neiva, dirjud	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
402		Creación relacion confianza	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
403		<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Riohacha</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 05/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
404		Asignación y creación de grupos dominio Neiva	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
405		Instalación PES en el controlador de Neiva	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
406		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
407		<b>Realizacion de pruebas</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 05/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
408		<b>Uso de herramienta de migración</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 05/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
409		Creación de grupos test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
410		Creacion usuarios test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
411		Creación computadores test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
412		Creación servidores test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
413		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
414		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
415		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
416		<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	<b>0%</b>	<b>50 días</b>	<b>lun 08/06/15</b>	<b>vie 14/08/15</b>
417		Migrar Usuarios	0%	50 días	lun 08/06/15	vie 14/08/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
418		Migrar Computadores	0%	50 días	lun 08/06/15	vie 14/08/15
419		<b>Migración Servidores</b>	<b>0%</b>	<b>6 días</b>	<b>lun 17/08/15</b>	<b>lun 24/08/15</b>
420		Migracion servidores	0%	6 días	lun 17/08/15	lun 24/08/15
421		<b>NEIVA MIGRADA</b>	0%	0 días	lun 24/08/15	lun 24/08/15
422		<b>Migracion Ibague</b>	<b>1%</b>	<b>63 días</b>	<b>jue 28/05/15</b>	<b>lun 24/08/15</b>
423		<b>Organización Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>jue 28/05/15</b>	<b>lun 08/06/15</b>
424		<b>Recepcion Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>jue 28/05/15</b>	<b>lun 08/06/15</b>
425		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15
426		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15
427		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15
428		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	vie 05/06/15	lun 08/06/15
429		<b>Configuración Prerequisitos</b>	<b>1%</b>	<b>58 días</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>lun 24/08/15</b>
430		<b>Configuración Controlador de dominio rama judicial</b>	<b>60%</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>jue 04/06/15</b>
431		Verificación instalación Sistema Operativo	100%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
432		Promoción a controlador de dominio	80%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
433		Instalación admt V32	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
434		<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
435		<b>Tareas dominio CSJ</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
436		<b>Creación relación de confianza</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>jue 04/06/15</b>
437		Creacion zonas stub DNS dominio Ibague, dirjud	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
438		Creación relacion confianza	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
439		<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Riohacha</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 05/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
440		Asignación y creación de grupos dominio Ibague	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
441		Instalación PES en el controlador de Ibague	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
442		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
443		<b>Realizacion de pruebas</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 05/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
444		<b>Uso de herramienta de migración</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 05/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
445		Creación de grupos test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
446		Creacion usuarios test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
447		Creación computadores test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
448		Creación servidores test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
449		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
450		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
451		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
452		<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	<b>0%</b>	<b>50 días</b>	<b>lun 08/06/15</b>	<b>vie 14/08/15</b>
453		Migrar Usuarios	0%	50 días	lun 08/06/15	vie 14/08/15
454		Migrar Computadores	0%	50 días	lun 08/06/15	vie 14/08/15
455		<b>Migración Servidores</b>	<b>0%</b>	<b>6 días</b>	<b>lun 17/08/15</b>	<b>lun 24/08/15</b>
456		Migracion servidores	0%	6 días	lun 17/08/15	lun 24/08/15
457		<b>IBAGUE MIGRADA</b>	0%	0 días	lun 24/08/15	lun 24/08/15
458		<b>Migracion Manizales</b>	<b>1%</b>	<b>63 días</b>	<b>mar 09/06/15</b>	<b>jue 03/09/15</b>
459		<b>Organización Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>mar 09/06/15</b>	<b>jue 18/06/15</b>
460		<b>Recepcion Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>mar 09/06/15</b>	<b>jue 18/06/15</b>
461		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	mar 09/06/15	mar 16/06/15
462		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	mar 09/06/15	mar 16/06/15
463		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	mar 09/06/15	mar 16/06/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
464		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	mié 17/06/15	jue 18/06/15
465		<b>Configuración Prerequisitos</b>	<b>1%</b>	<b>58 días</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>jue 03/09/15</b>
466		<b>Configuración Controlador de dominio rama judicial</b>	<b>60%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>mar 16/06/15</b>
467		Verificación instalación Sistema Operativo	100%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
468		Promoción a controlador de dominio	80%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
469		Instalación admt V32	0%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
470		<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>mié 17/06/15</b>
471		<b>Tareas dominio CSJ</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>mié 17/06/15</b>
472		<b>Creación relación de confianza</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>mar 16/06/15</b>
473		Creacion zonas stub DNS dominio Manisalez, dirjud	0%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
474		Creación relacion confianza	0%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
475		<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Manisalez</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 17/06/15</b>	<b>mié 17/06/15</b>
476		Asignación y creación de grupos dominio Manisalez	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
477		Instalación PES en el controlador de Manisalez	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
478		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
479		<b>Realizacion de pruebas</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 17/06/15</b>	<b>mié 17/06/15</b>
480		<b>Uso de herramienta de migración</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 17/06/15</b>	<b>mié 17/06/15</b>
481		Creación de grupos test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
482		Creacion usuarios test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
483		Creación computadores test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
484		Creación servidores test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
485		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
486		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
487		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
488		<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	<b>0%</b>	<b>50 días</b>	<b>jue 18/06/15</b>	<b>mié 26/08/15</b>
489		Migrar Usuarios	0%	50 días	jue 18/06/15	mié 26/08/15
490		Migrar Computadores	0%	50 días	jue 18/06/15	mié 26/08/15
491		<b>Migración Servidores</b>	<b>0%</b>	<b>6 días</b>	<b>jue 27/08/15</b>	<b>jue 03/09/15</b>
492		Migracion servidores	0%	6 días	jue 27/08/15	jue 03/09/15
493		<b>MANIZALES MIGRADA</b>	0%	0 días	jue 03/09/15	jue 03/09/15
494		<b>Migracion Cartagena</b>	<b>0%</b>	<b>68 días</b>	<b>mar 09/06/15</b>	<b>jue 10/09/15</b>
529		<b>CARTAGENA MIGRADA</b>	0%	0 días	jue 10/09/15	jue 10/09/15
530		<b>Migracion Tunja</b>	<b>1%</b>	<b>70 días</b>	<b>mar 09/06/15</b>	<b>lun 14/09/15</b>
531		<b>Organización Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>mar 09/06/15</b>	<b>jue 18/06/15</b>
532		<b>Recepcion Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>mar 09/06/15</b>	<b>jue 18/06/15</b>
533		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	mar 09/06/15	mar 16/06/15
534		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	mar 09/06/15	mar 16/06/15
535		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	mar 09/06/15	mar 16/06/15
536		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	mié 17/06/15	jue 18/06/15
537		<b>Configuración Prerequisitos</b>	<b>1%</b>	<b>65 días</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>lun 14/09/15</b>
538		<b>Configuracion Controlador de dominio rama judicial</b>	<b>33%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>mar 16/06/15</b>
539		Verificación instalación Sistema Operativo	100%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
540		Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
541		Instalación admt V32	0%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
542		<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>mié 17/06/15</b>
543		<b>Tareas dominio CSJ</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>mié 17/06/15</b>

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
544		<b>Creación relación de confianza</b>	0%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
545		Creacion zonas stub DNS dominio Tunja, dirjud	0%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
546		Creación relacion confianza	0%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
547		<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Tunja</b>	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
548		Asignación y creación de grupos dominio Tunja	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
549		Instalación PES en el controlador de Tunja	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
550		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
551		<b>Realizacion de pruebas</b>	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
552		<b>Uso de herramienta de migración</b>	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
553		Creación de grupos test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
554		Creacion usuarios test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
555		Creación computadores test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
556		Creación servidores test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
557		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
558		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
559		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
560		<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	0%	60 días	jue 18/06/15	mié 09/09/15
561		Migrar Usuarios	0%	60 días	jue 18/06/15	mié 09/09/15
562		Migrar Computadores	0%	60 días	jue 18/06/15	mié 09/09/15
563		<b>Migración Servidores</b>	0%	3 días	jue 10/09/15	lun 14/09/15
564		Migracion servidores	0%	3 días	jue 10/09/15	lun 14/09/15
565		<b>TUNJA MIGRADA</b>	0%	0 días	lun 14/09/15	lun 14/09/15
566		<b>Migracion Barranquilla</b>	1%	70 días	lun 20/04/15	vie 24/07/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
567		<b>Organización Información</b>	0%	8 días	lun 20/04/15	mié 29/04/15
568		<b>Recepcion Información</b>	0%	8 días	lun 20/04/15	mié 29/04/15
569		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15
570		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15
571		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15
572		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	mar 28/04/15	mié 29/04/15
573		<b>Configuración Prerequisitos</b>	1%	65 días	lun 27/04/15	vie 24/07/15
574		<b>Configuracion Controlador de dominio rama judicial</b>	33%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
575		Verificación instalación Sistema Operativo	100%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
576		Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
577		Instalación admt V32	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
578		<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	0%	2 días	lun 27/04/15	mar 28/04/15
579		<b>Tareas dominio CSJ</b>	0%	2 días	lun 27/04/15	mar 28/04/15
580		<b>Creación relación de confianza</b>	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
581		Creacion zonas stub DNS dominio Barranquilla, dirjud	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
582		Creación relacion confianza	0%	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15
583		<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Barranquilla</b>	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
584		Asignación y creación de grupos dominio Barranquilla	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
585		Instalación PES en el controlador de Barranquilla	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
586		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
587		<b>Realizacion de pruebas</b>	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
588		<b>Uso de herramienta de migración</b>	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
589		Creación de grupos test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
590		Creacion usuarios test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
591		Creación computadores test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
592		Creación servidores test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
593		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
594		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
595		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15
596		<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	<b>0%</b>	<b>60 días</b>	<b>mié 29/04/15</b>	<b>mar 21/07/15</b>
597		Migrar Usuarios	0%	60 días	mié 29/04/15	mar 21/07/15
598		Migrar Computadores	0%	60 días	mié 29/04/15	mar 21/07/15
599		<b>Migración Servidores</b>	<b>0%</b>	<b>3 días</b>	<b>mié 22/07/15</b>	<b>vie 24/07/15</b>
600		Migracion servidores	0%	3 días	mié 22/07/15	vie 24/07/15
601		<b>BARRANQUILLA MIGRADA</b>	0%	0 días	vie 24/07/15	vie 24/07/15
602		<b>Migracion Cali</b>	<b>1%</b>	<b>70 días</b>	<b>mar 09/06/15</b>	<b>lun 14/09/15</b>
603		<b>Organización Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>mar 09/06/15</b>	<b>jue 18/06/15</b>
604		<b>Recepcion Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>mar 09/06/15</b>	<b>jue 18/06/15</b>
605		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	mar 09/06/15	mar 16/06/15
606		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	mar 09/06/15	mar 16/06/15
607		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	mar 09/06/15	mar 16/06/15
608		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	mié 17/06/15	jue 18/06/15
609		<b>Configuración Prerequisitos</b>	<b>1%</b>	<b>65 días</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>lun 14/09/15</b>
610		<b>Configuracion Controlador de dominio rama judicial</b>	<b>33%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>mar 16/06/15</b>
611		Verificación instalación Sistema Operativo	100%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
612		Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
613		Instalación admt V32	0%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
614		<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>mié 17/06/15</b>
615		<b>Tareas dominio CSJ</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>mié 17/06/15</b>
616		<b>Creación relación de confianza</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 16/06/15</b>	<b>mar 16/06/15</b>
617		Creacion zonas stub DNS dominio Cali, dirjud	0%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
618		Creación relacion confianza	0%	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15
619		<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Cali</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 17/06/15</b>	<b>mié 17/06/15</b>
620		Asignación y creación de grupos dominio Cali	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
621		Instalación PES en el controlador de Cali	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
622		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
623		<b>Realizacion de pruebas</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 17/06/15</b>	<b>mié 17/06/15</b>
624		<b>Uso de herramienta de migración</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 17/06/15</b>	<b>mié 17/06/15</b>
625		Creación de grupos test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
626		Creacion usuarios test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
627		Creación computadores test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
628		Creación servidores test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
629		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
630		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
631		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15
632		<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	<b>0%</b>	<b>60 días</b>	<b>jue 18/06/15</b>	<b>mié 09/09/15</b>
633		Migrar Usuarios	0%	60 días	jue 18/06/15	mié 09/09/15
634		Migrar Computadores	0%	60 días	jue 18/06/15	mié 09/09/15
635		<b>Migración Servidores</b>	<b>0%</b>	<b>3 días</b>	<b>jue 10/09/15</b>	<b>lun 14/09/15</b>

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
636		Migracion servidores	0%	3 días	jue 10/09/15	lun 14/09/15
637		<b>CALI MIGRADA</b>	0%	0 días	lun 14/09/15	lun 14/09/15
638		<b>Migracion Medellín</b>	<b>1%</b>	<b>80 días</b>	<b>jue 28/05/15</b>	<b>mié 16/09/15</b>
639		<b>Organización Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>jue 28/05/15</b>	<b>lun 08/06/15</b>
640		<b>Recepcion Información</b>	<b>0%</b>	<b>8 días</b>	<b>jue 28/05/15</b>	<b>lun 08/06/15</b>
641		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15
642		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15
643		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15
644		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	vie 05/06/15	lun 08/06/15
645		<b>Configuración Prerequisitos</b>	<b>1%</b>	<b>75 días</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>mié 16/09/15</b>
646		<b>Configuracion Controlador de dominio rama judicial</b>	<b>33%</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>jue 04/06/15</b>
647		Verificación instalación Sistema Operativo	100%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
648		Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
649		Instalación admt V32	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
650		<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
651		<b>Tareas dominio CSJ</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
652		<b>Creación relación de confianza</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>jue 04/06/15</b>
653		Creacion zonas stub DNS dominio Medellín, dirjud	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
654		Creación relacion confianza	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
655		<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Riohacha</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 05/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
656		Asignación y creación de grupos dominio Medellín	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
657		Instalación PES en el controlador de Medellín	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
658		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
659		<b>Realizacion de pruebas</b>	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
660		<b>Uso de herramienta de migración</b>	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
661		Creación de grupos test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
662		Creacion usuarios test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
663		Creación computadores test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
664		Creación servidores test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
665		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
666		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
667		Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
668		<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	0%	70 días	lun 08/06/15	vie 11/09/15
669		Migrar Usuarios	0%	70 días	lun 08/06/15	vie 11/09/15
670		Migrar Computadores	0%	70 días	lun 08/06/15	vie 11/09/15
671		<b>Migración Servidores</b>	0%	3 días	lun 14/09/15	mié 16/09/15
672		Migracion servidores	0%	3 días	lun 14/09/15	mié 16/09/15
673		<b>MEDELLIN MIGRADA</b>	0%	0 días	mié 16/09/15	mié 16/09/15
674		<b>Migracion Monteria</b>	0%	80 días	jue 28/05/15	mié 16/09/15
709		<b>MONTERIA MIGRADA</b>	0%	0 días	mié 16/09/15	mié 16/09/15
710		<b>Migracion Bucaramanga</b>	1%	80 días	jue 28/05/15	mié 16/09/15
711		<b>Organización Información</b>	0%	8 días	jue 28/05/15	lun 08/06/15
712		<b>Recepcion Información</b>	0%	8 días	jue 28/05/15	lun 08/06/15
713		Usuarios con login, OU actual, Maquina Correspondiente	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15
714		Equipos con nombre actual y departamento/dependencia ubicacion	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15
715		Servidores con ubicacion y aplicaciones instaladas	0%	6 días	jue 28/05/15	jue 04/06/15

Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			




















Id	Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
716		Analisis y organizacion informacion	0%	2 días	vie 05/06/15	lun 08/06/15
717		<b>Configuración Prerequisitos</b>	<b>1%</b>	<b>75 días</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>mié 16/09/15</b>
718		<b>Configuración Controlador de dominio rama judicial</b>	<b>33%</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>jue 04/06/15</b>
719		Verificación instalación Sistema Operativo	100%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
720		Promoción a controlador de dominio	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
721		Instalación admt V32	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
722		<b>Configuración zonas stub en ambos dominios</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
723		<b>Tareas dominio CSJ</b>	<b>0%</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
724		<b>Creación relación de confianza</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 04/06/15</b>	<b>jue 04/06/15</b>
725		Creacion zonas stub DNS dominio Bucaramanga, dirjud	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
726		Creación relacion confianza	0%	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15
727		<b>Instalación PES (Password Export Server) Dominio Bucaramanga</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 05/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
728		Asignación y creación de grupos dominio Bucaramanga	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
729		Instalación PES en el controlador de Bucaramanga	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
730		Asignacion privilegios usuarios remotos	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
731		<b>Realizacion de pruebas</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 05/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
732		<b>Uso de herramienta de migración</b>	<b>0%</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 05/06/15</b>	<b>vie 05/06/15</b>
733		Creación de grupos test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
734		Creacion usuarios test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
735		Creación computadores test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
736		Creación servidores test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
737		Asignación de acceso a los recursos	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
738		Garantizar la membresía al usuario Test	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15










Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			




















Id		Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
739			Migración de el/los grupos a los cuales pertenece el usuario	0%	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15
740			<b>Migracion Usuarios y Computadores</b>	<b>0%</b>	<b>70 días</b>	<b>lun 08/06/15</b>	<b>vie 11/09/15</b>
741			Migrar Usuarios	0%	70 días	lun 08/06/15	vie 11/09/15
742			Migrar Computadores	0%	70 días	lun 08/06/15	vie 11/09/15
743			<b>Migración Servidores</b>	<b>0%</b>	<b>3 días</b>	<b>lun 14/09/15</b>	<b>mié 16/09/15</b>
744			Migracion servidores	0%	3 días	lun 14/09/15	mié 16/09/15
745			<b>BUCARAMANGA MIGRADA</b>	0%	0 días	mié 16/09/15	mié 16/09/15
746			<b>Migracion Bogota/Cundinamarca</b>	<b>0%</b>	<b>134 días</b>	<b>mar 28/04/15</b>	<b>vie 30/10/15</b>
747			Migracion Bogota/Cundinamarca	0%	1 día?	mar 28/04/15	mar 28/04/15
748			<b>BOGOTA/CUNDINAMARCA MIGRADO</b>	0%	0 días	lun 20/04/15	lun 20/04/15
749			<b>ESTABILIZACION Y AFINAMIENTO</b>	<b>0%</b>	<b>33 días</b>	<b>mié 16/09/15</b>	<b>vie 30/10/15</b>
750			Estabilizacion y Afinamiento Riohacha	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
751			Estabilizacion y AfinamientoSincelejo	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
752			Estabilizacion y Afinamiento Valledupar	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
753			Estabilizacion y Afinamiento Popayan	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
754			Estabilizacion y Afinamiento Pereira	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
755			Estabilizacion y Afinamiento Armenia	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
756			Estabilizacion y Afinamiento Santa Marta	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
757			Estabilizacion y Afinamiento Villavicencio	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
758			Estabilizacion y Afinamiento Pasto	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
759			Estabilizacion y Afinamiento Cucuta	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
760			Estabilizacion y Afinamiento Neiva	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
761			Estabilizacion y Afinamiento Ibague	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15


Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id		Modo de tarea	Task Name	% completado	Duración	Comienzo	Fin
762			Estabilizacion y Afinamiento Manizales	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
763			Estabilizacion y Afinamiento Cartagena	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
764			Estabilizacion y Afinamiento Tunja	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
765			Estabilizacion y Afinamiento Barranquilla	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
766			Estabilizacion y Afinamiento Cali	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
767			Estabilizacion y Afinamiento Medellin	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
768			Estabilizacion y Afinamiento Monteria	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15
769			Estabilizacion y Afinamiento Bucaramanga	0%	33 días	mié 16/09/15	vie 30/10/15


Project: DAU v3 08\_04\_2015  
Date: jue 09/04/15

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

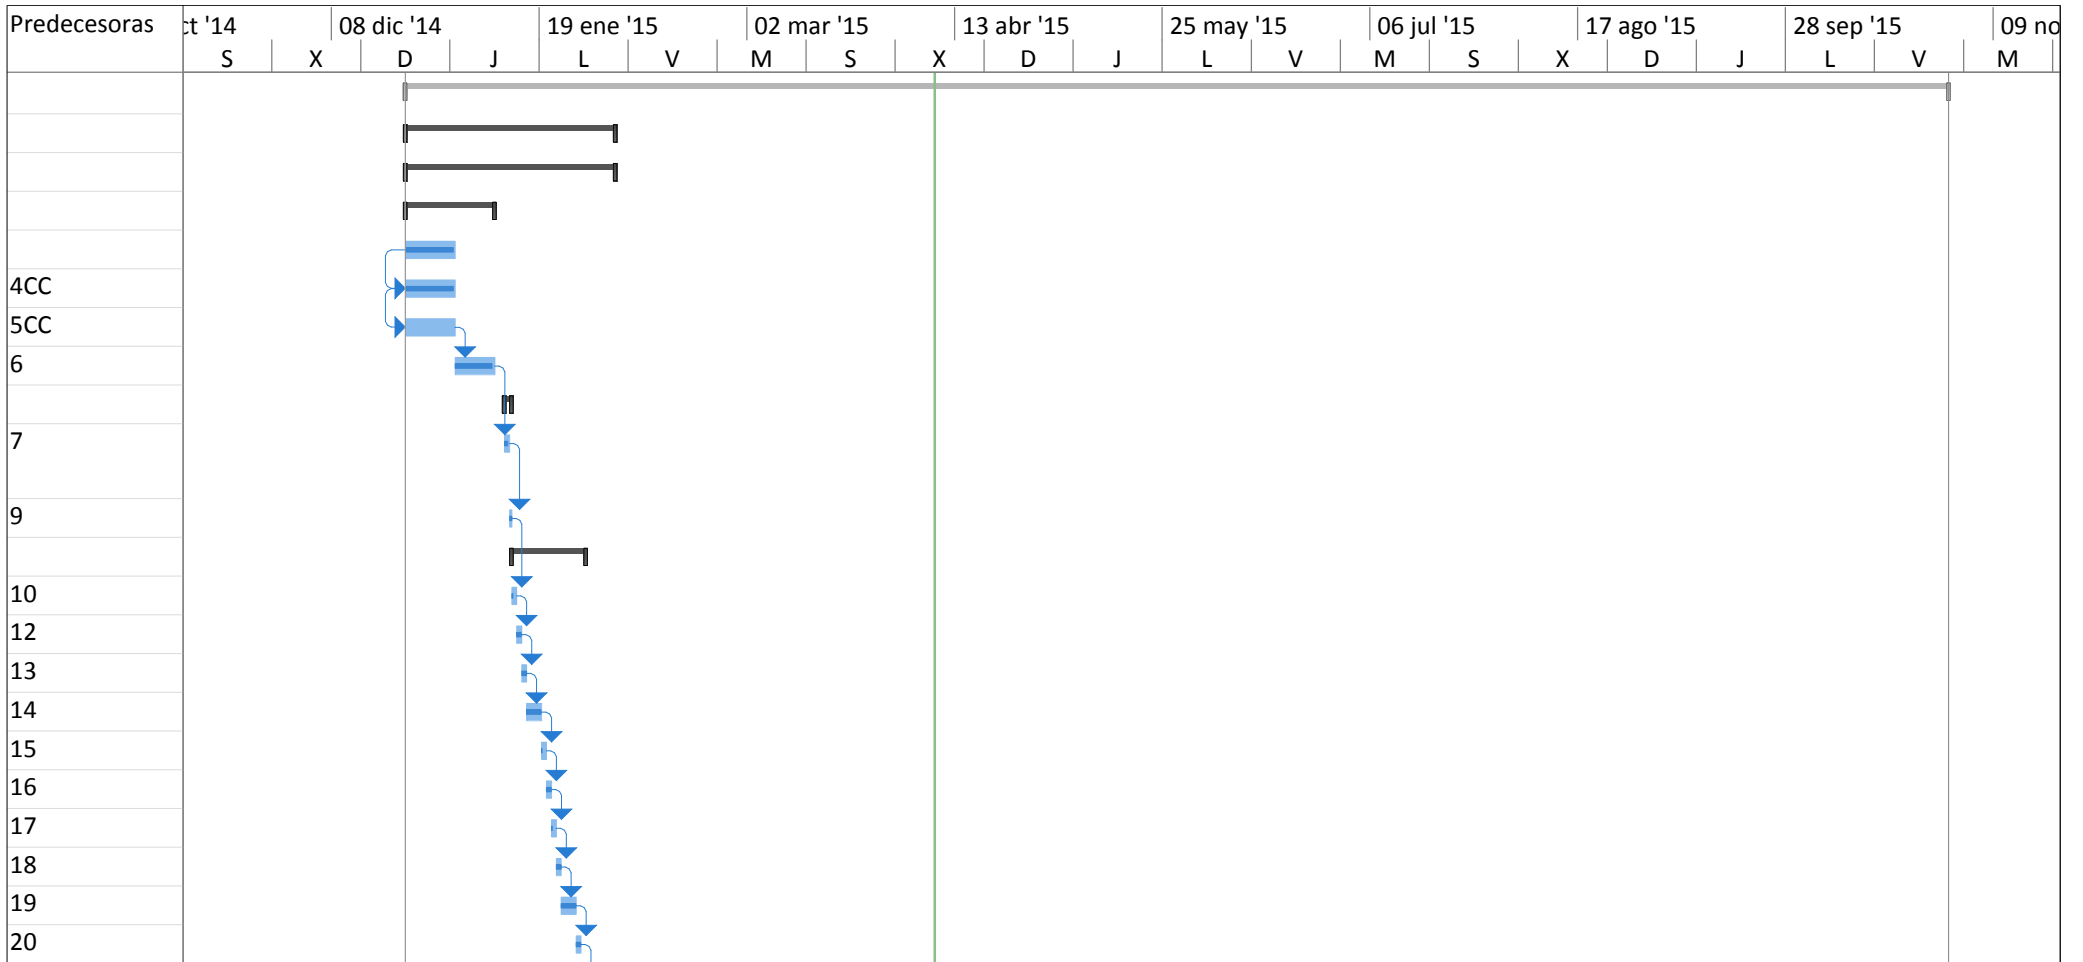


Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			



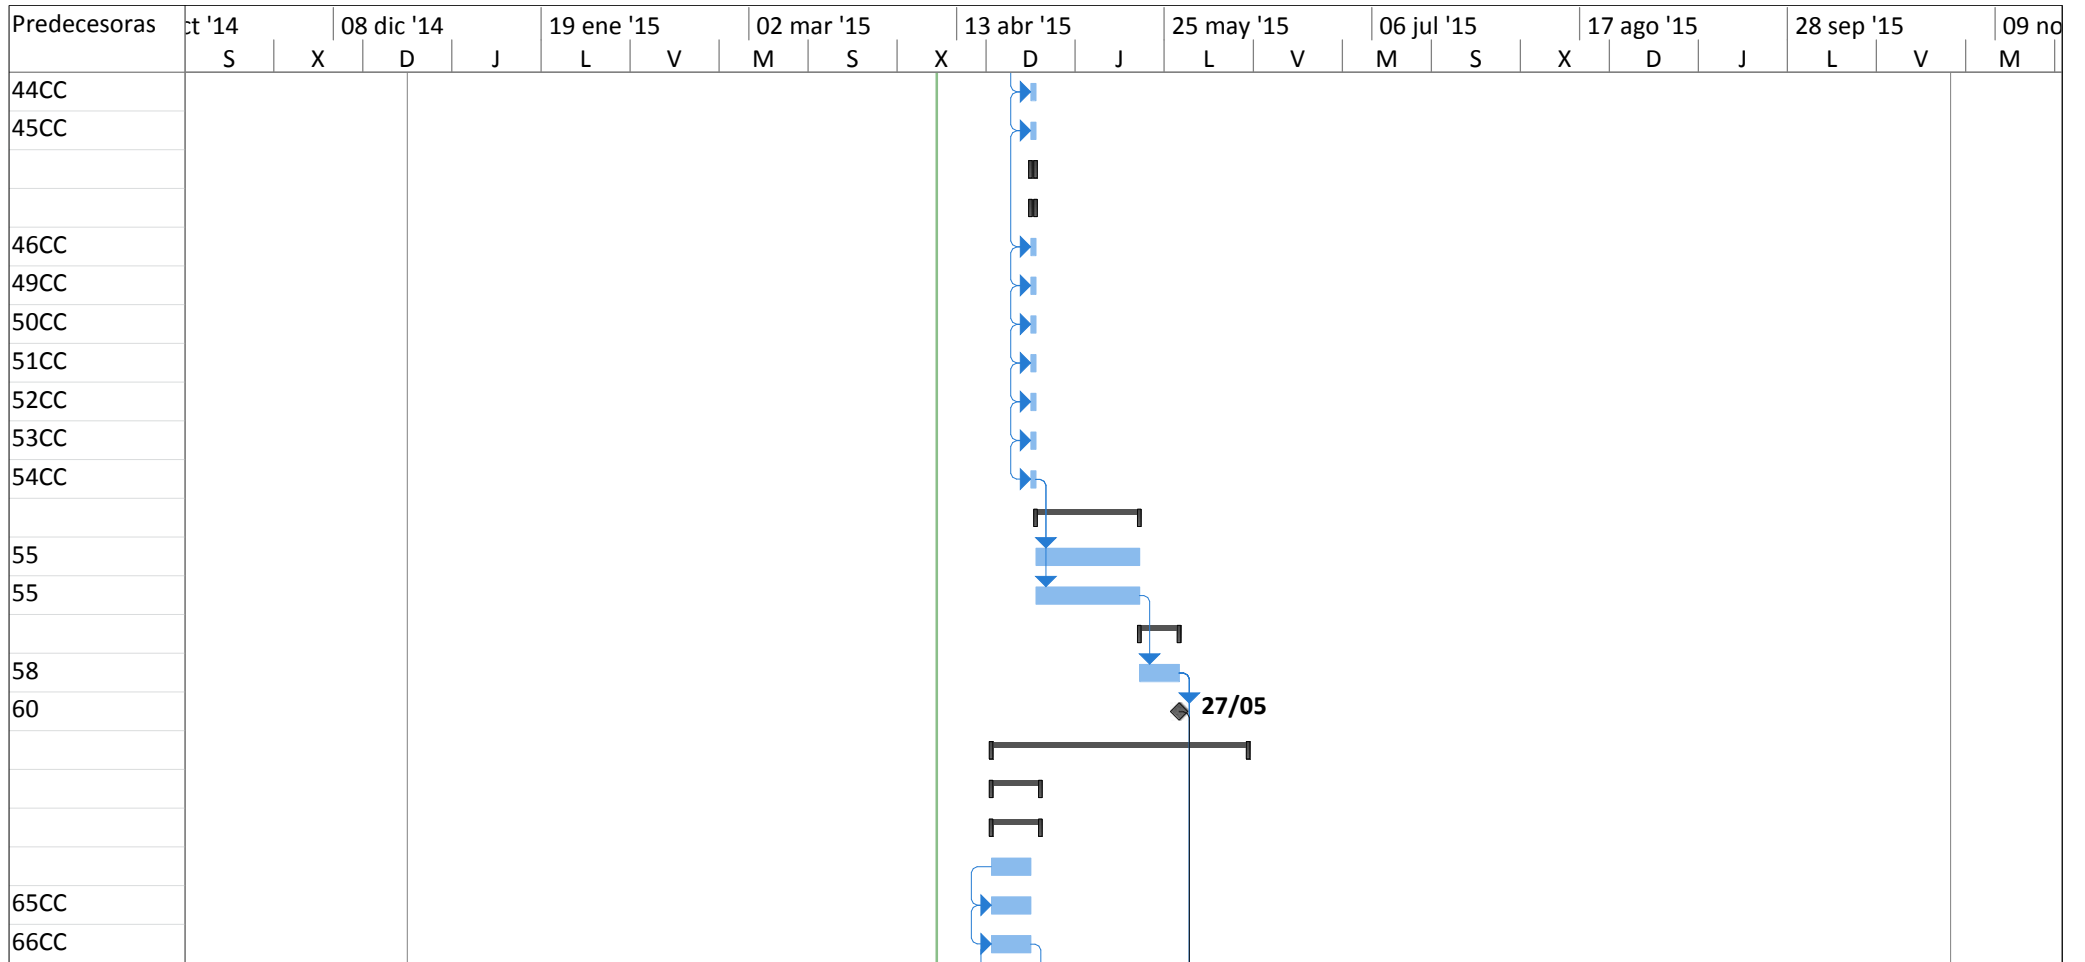


Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			




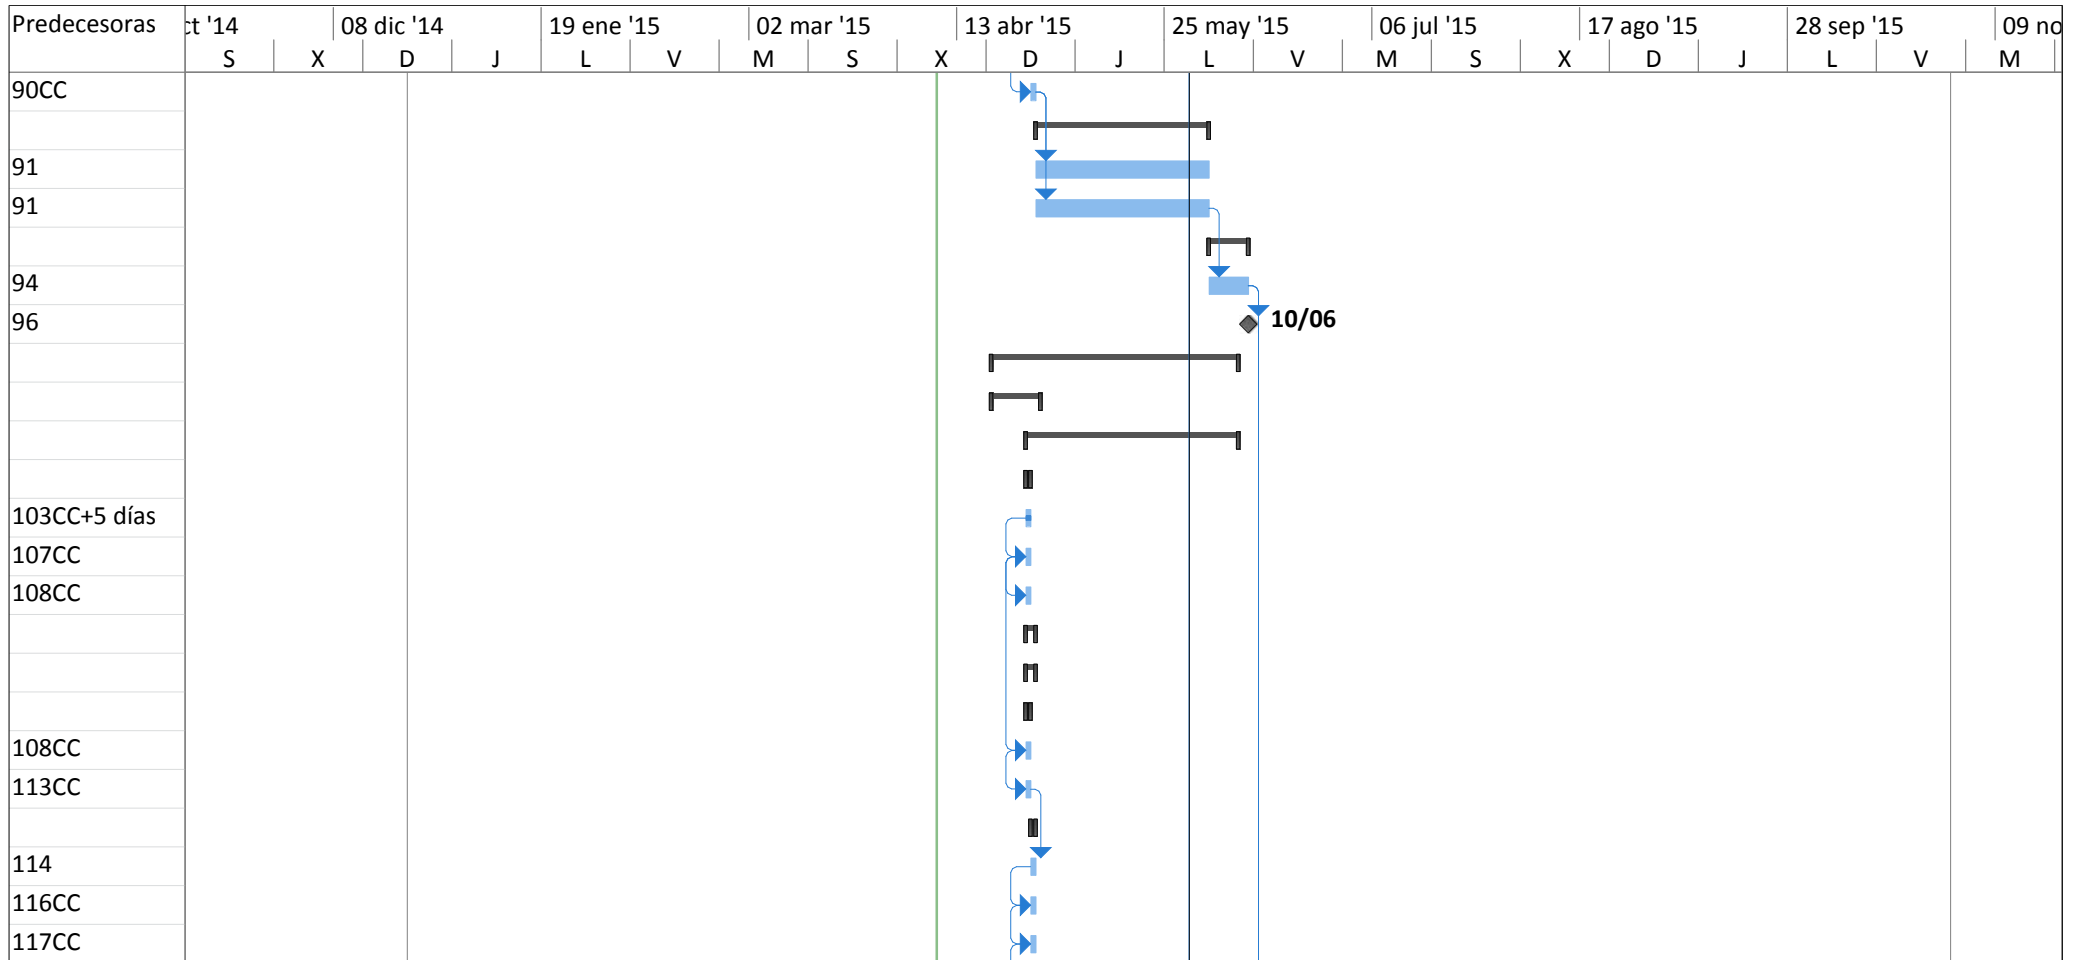

Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

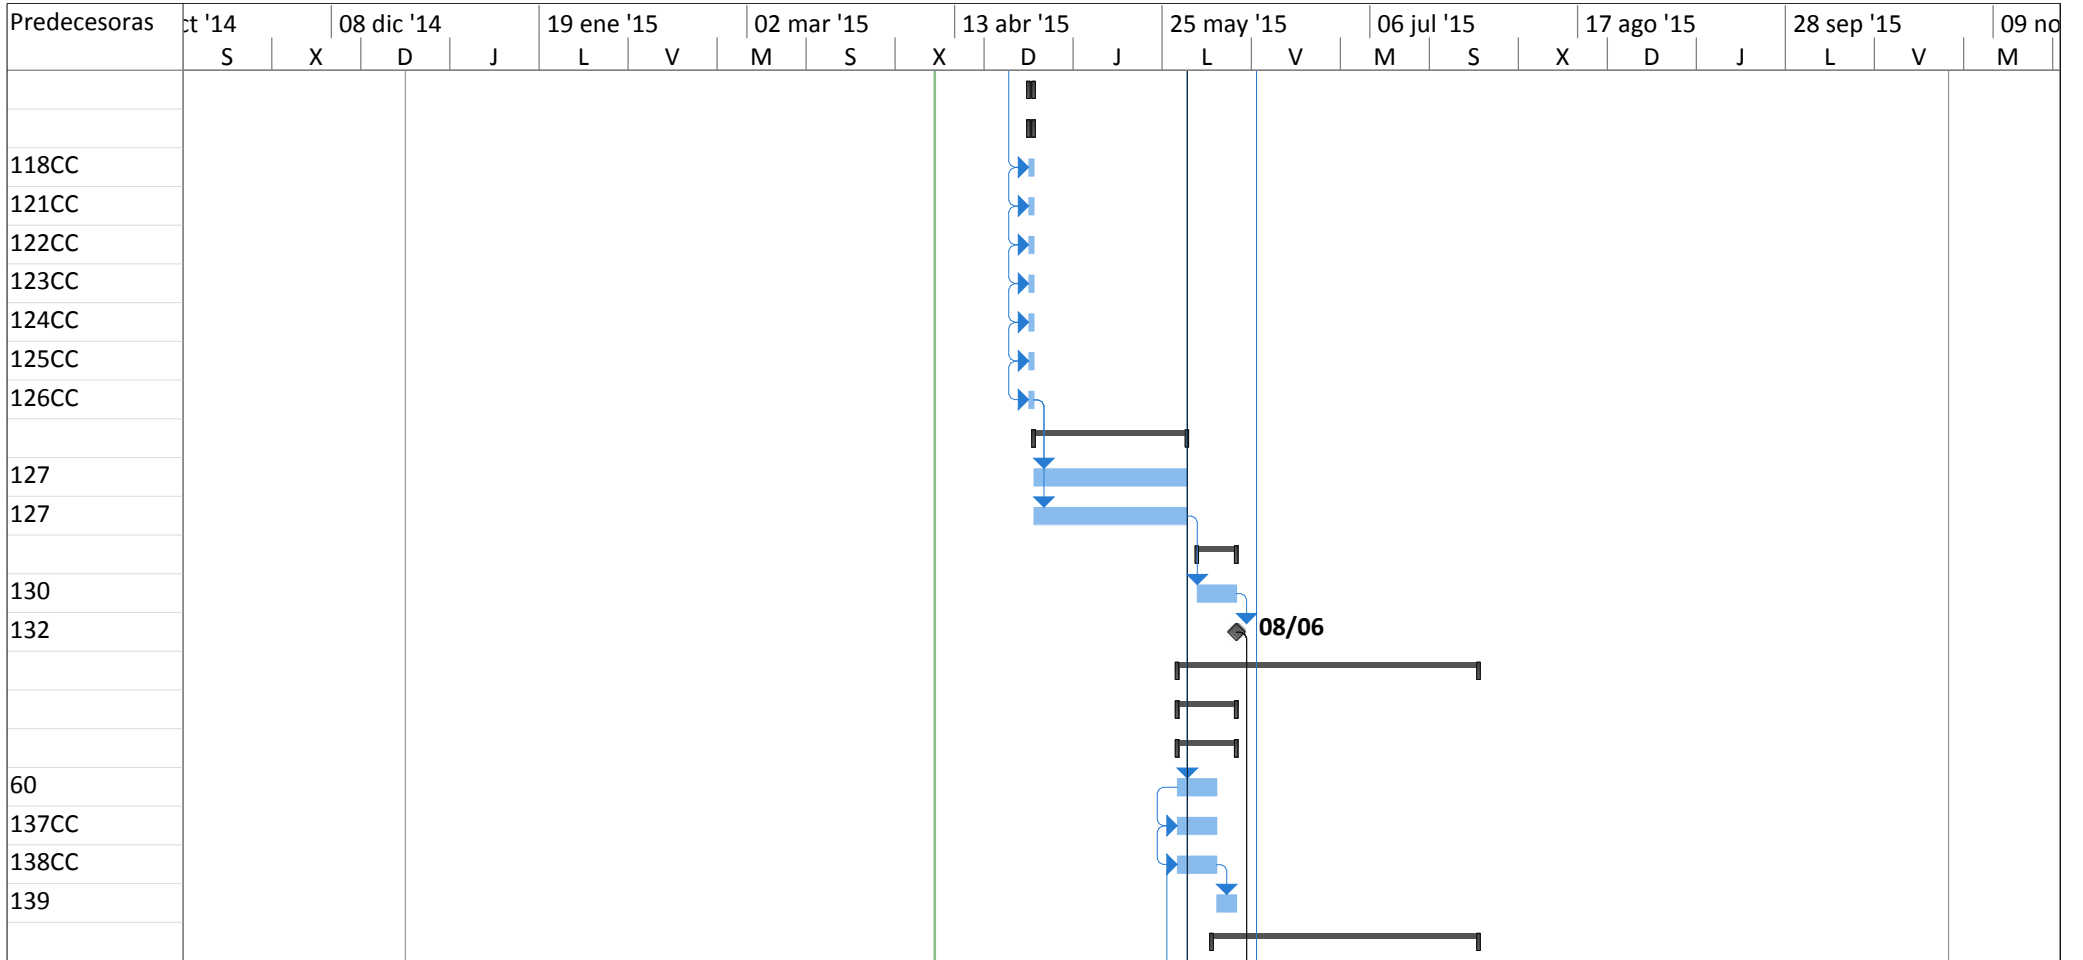


Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

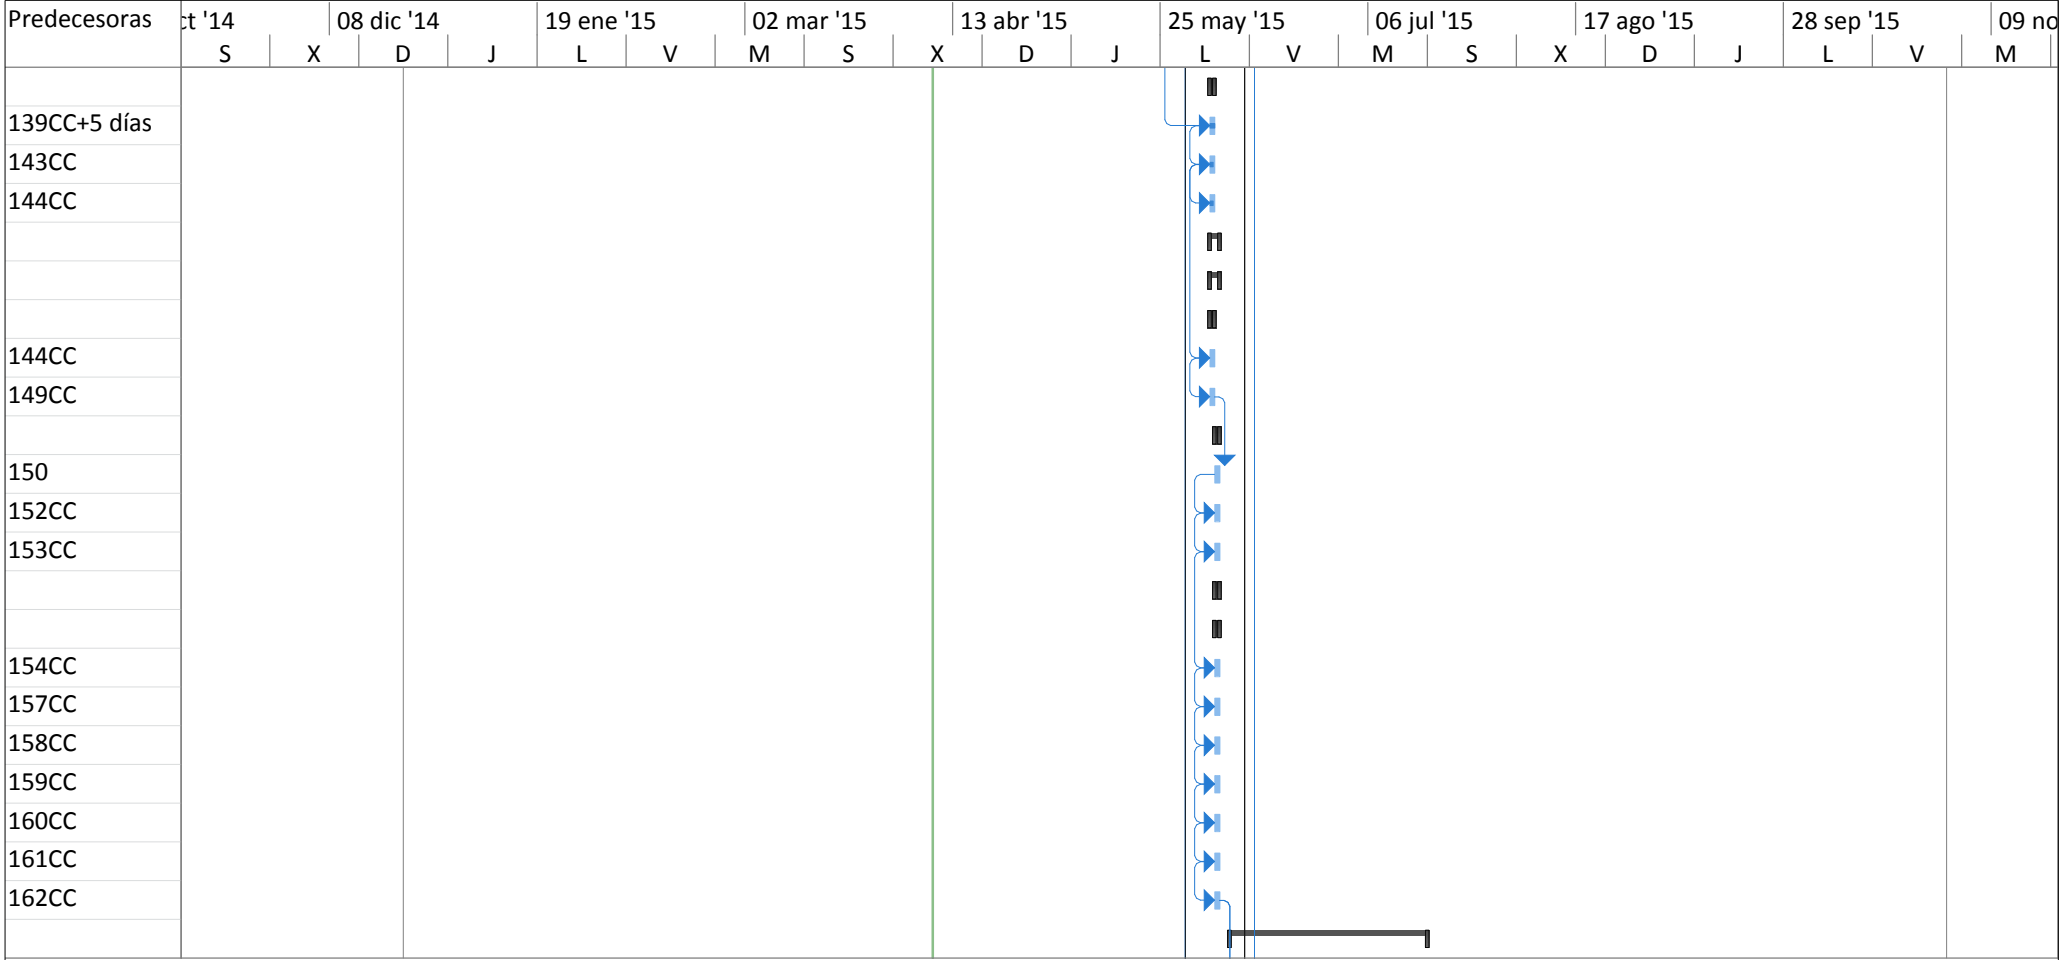


Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			



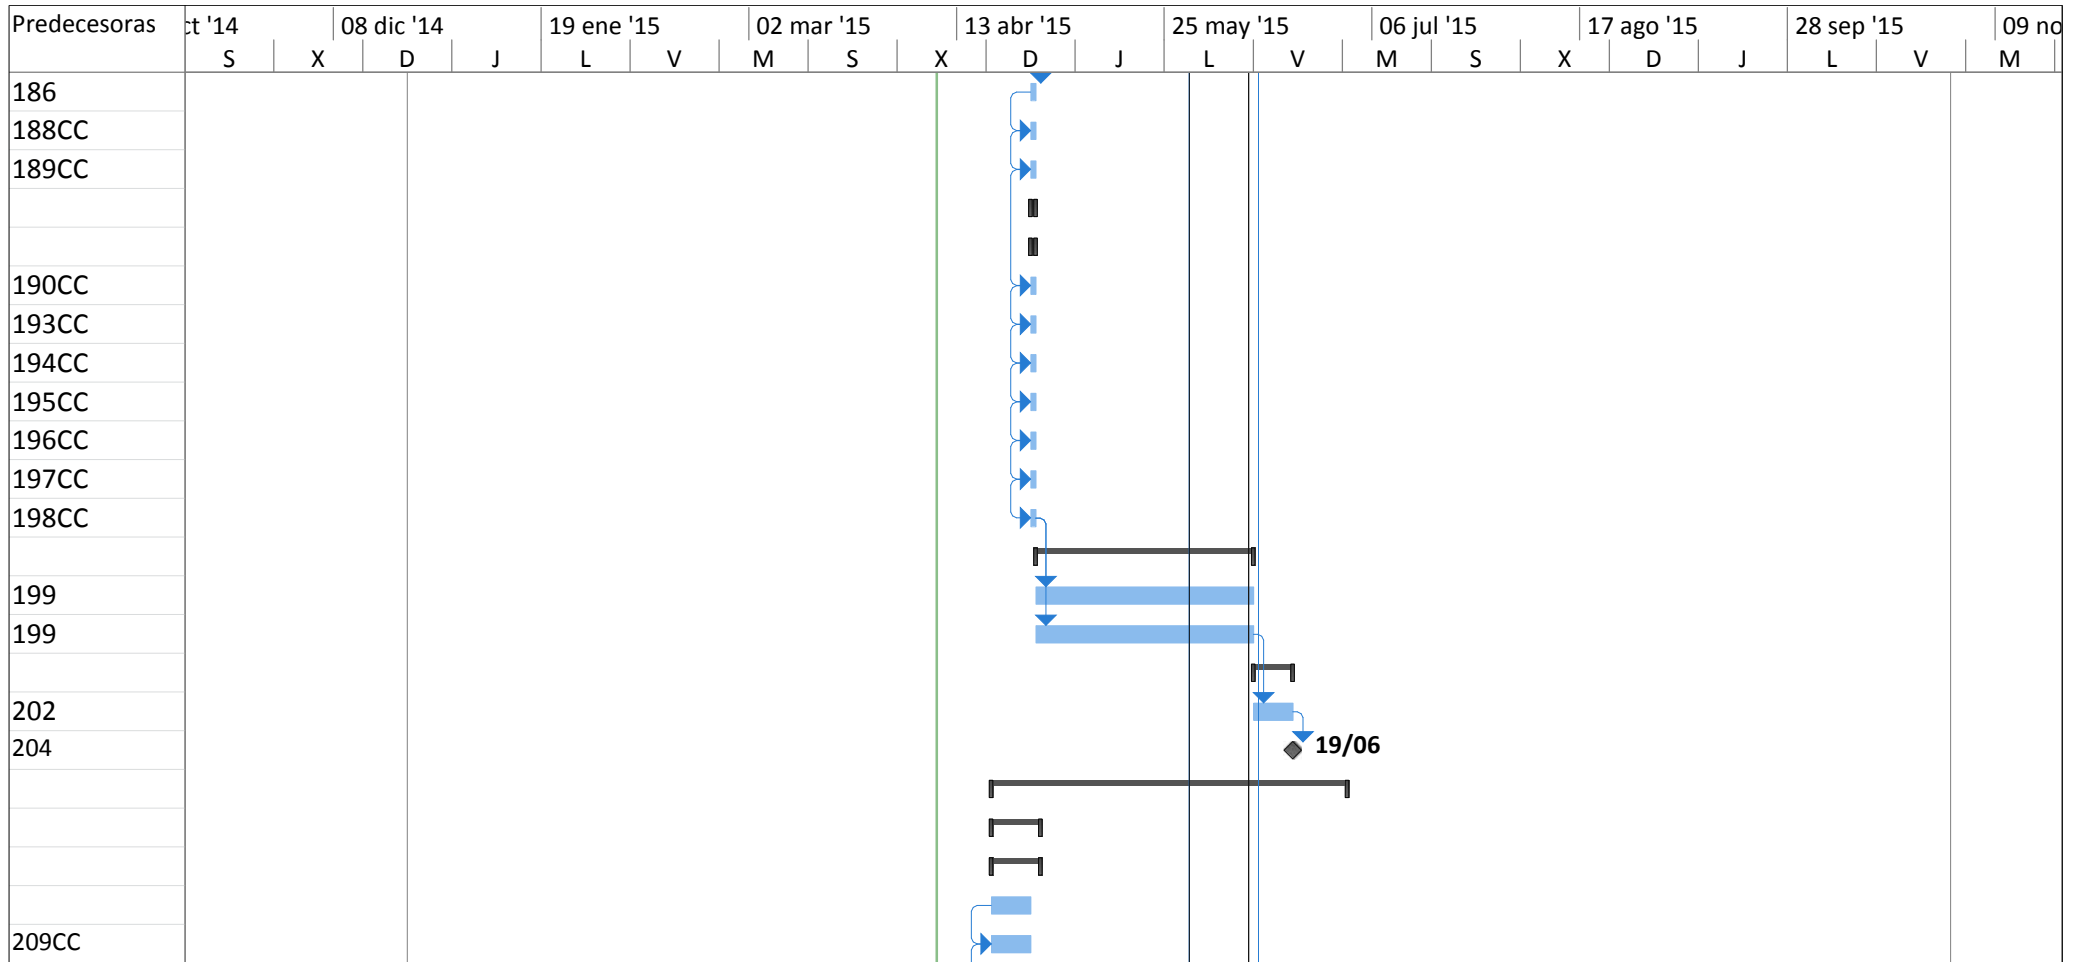


Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			



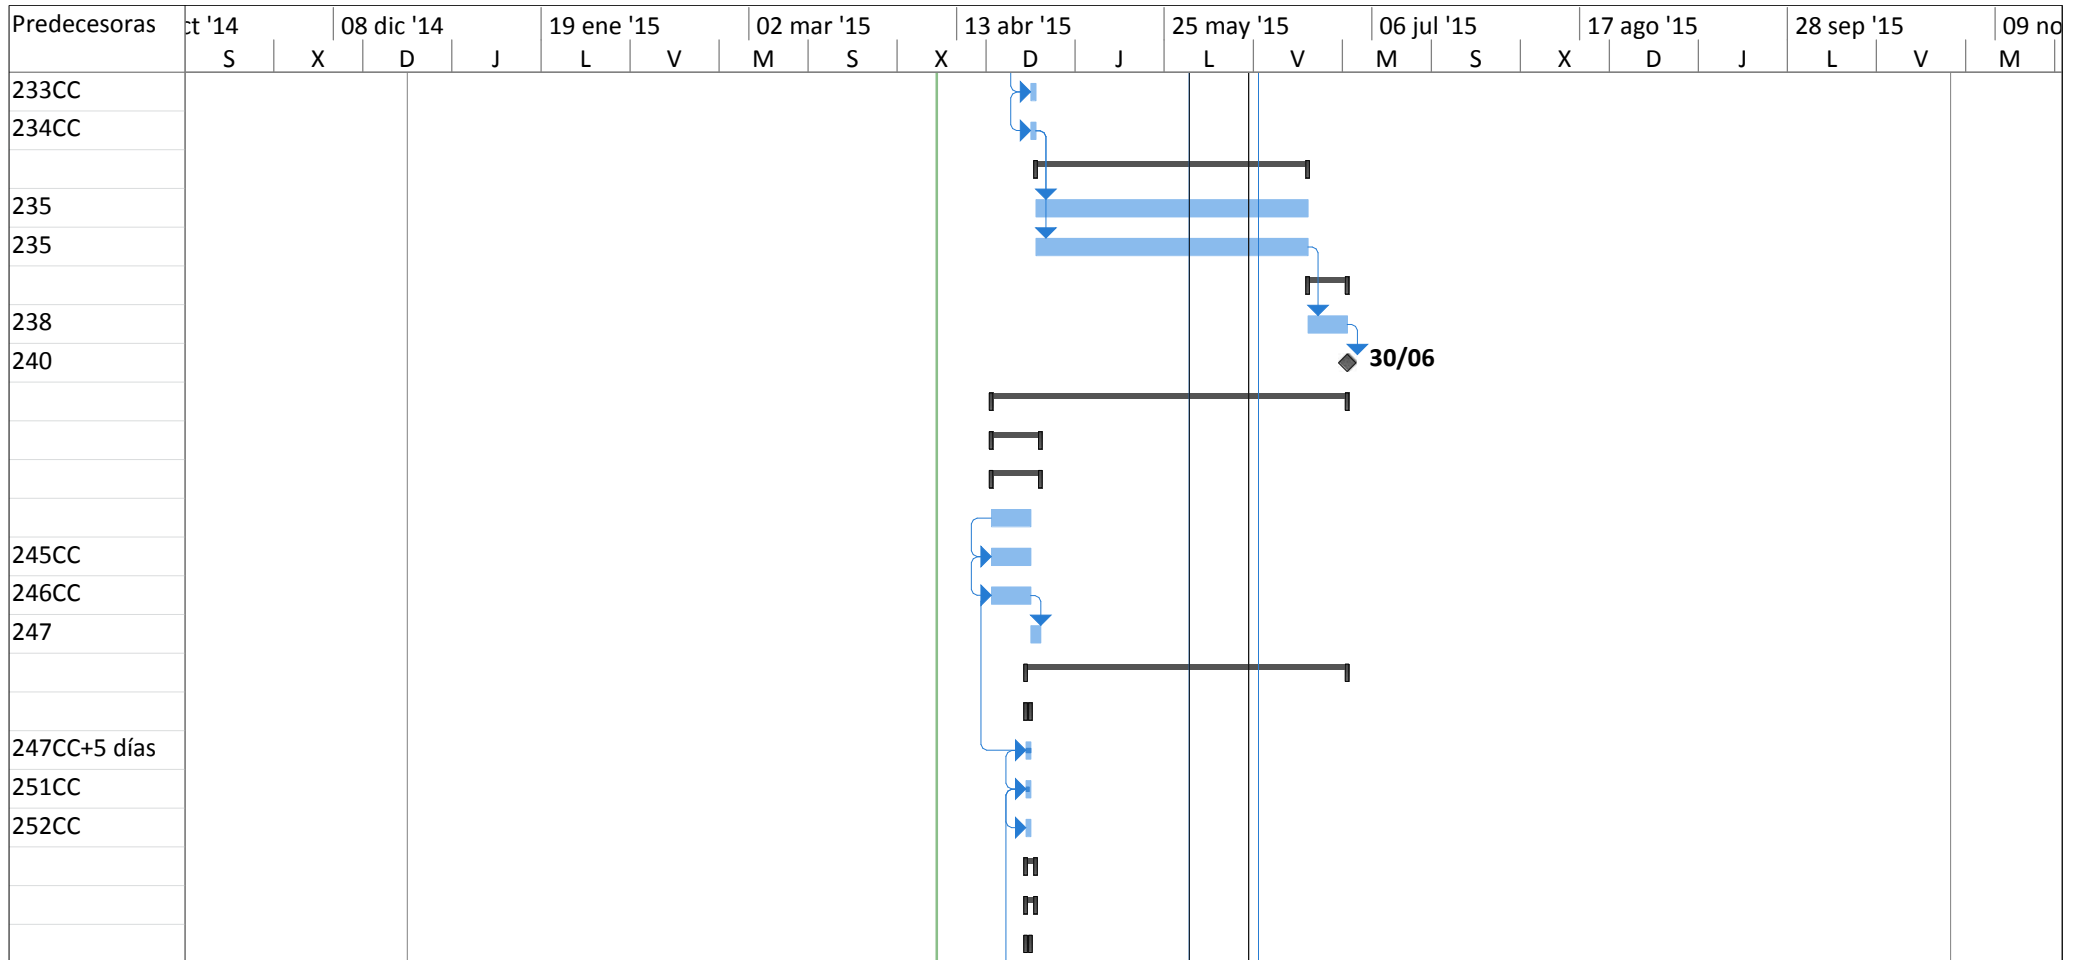

Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			




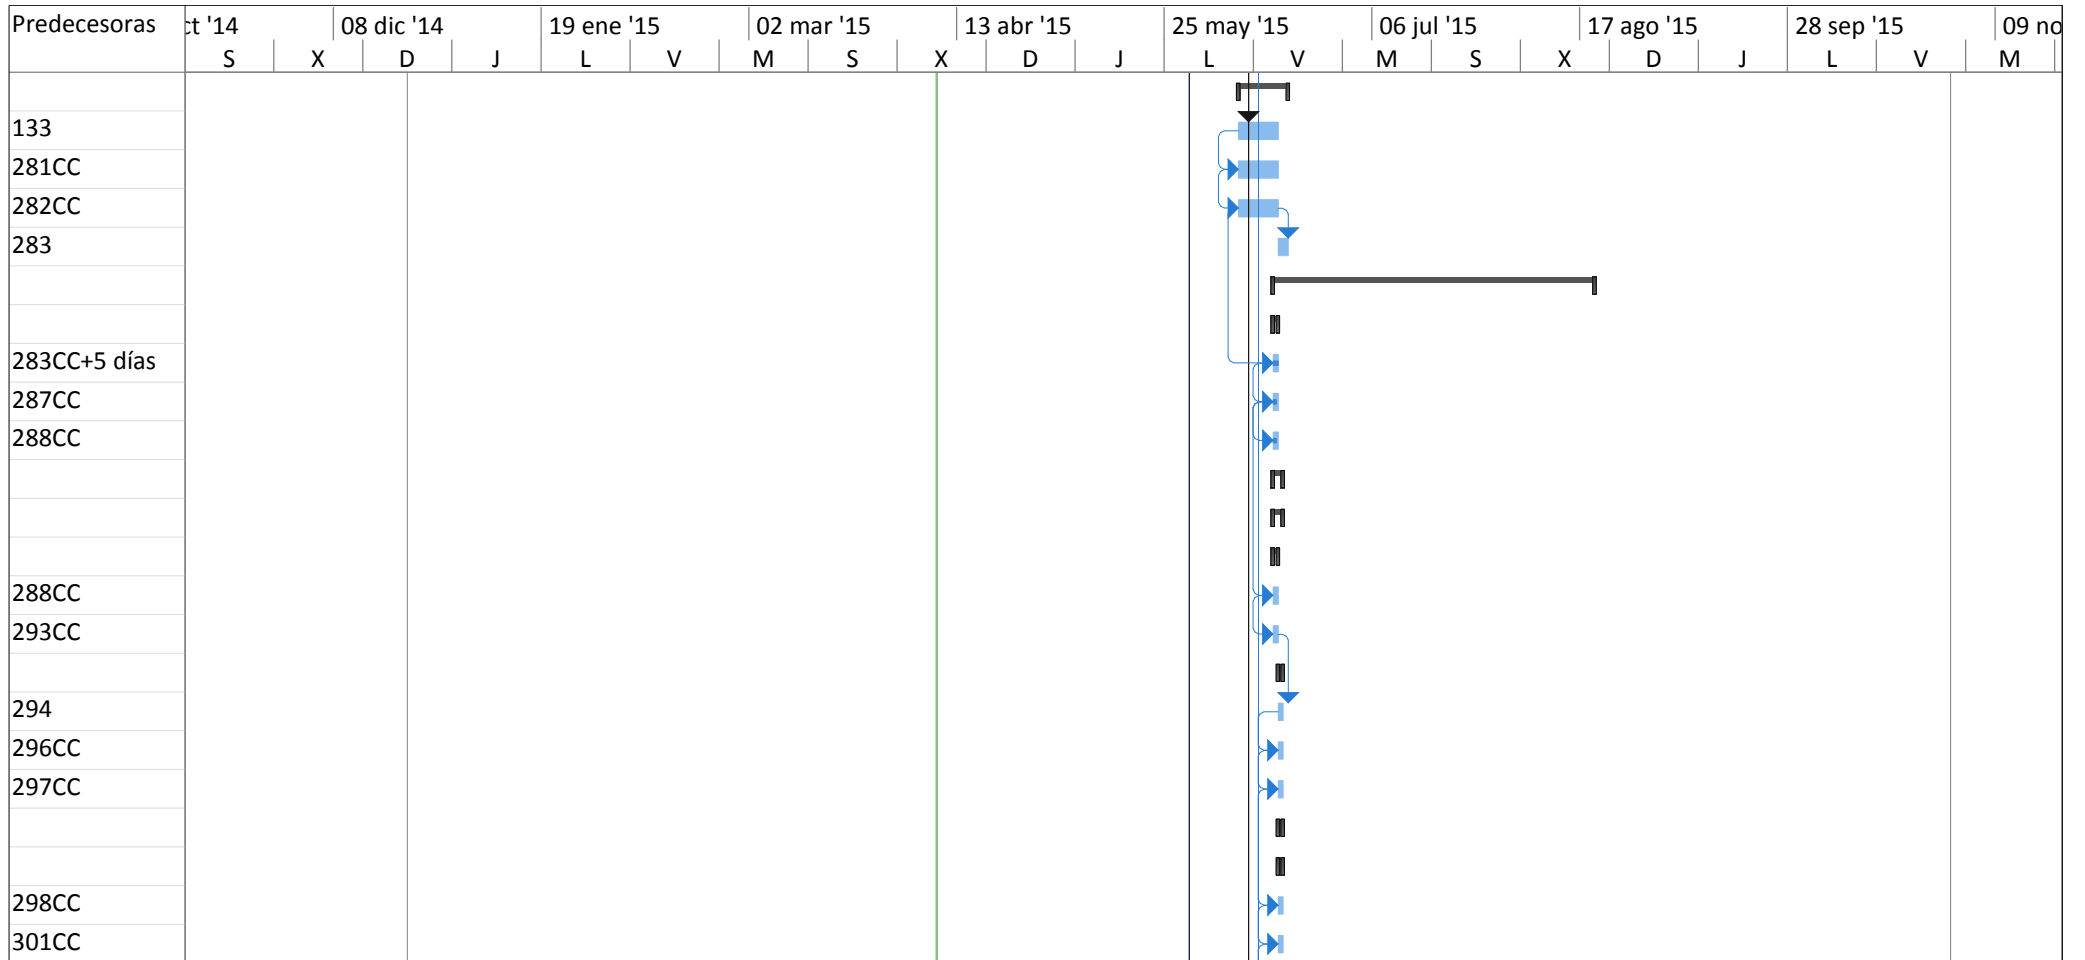


Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			






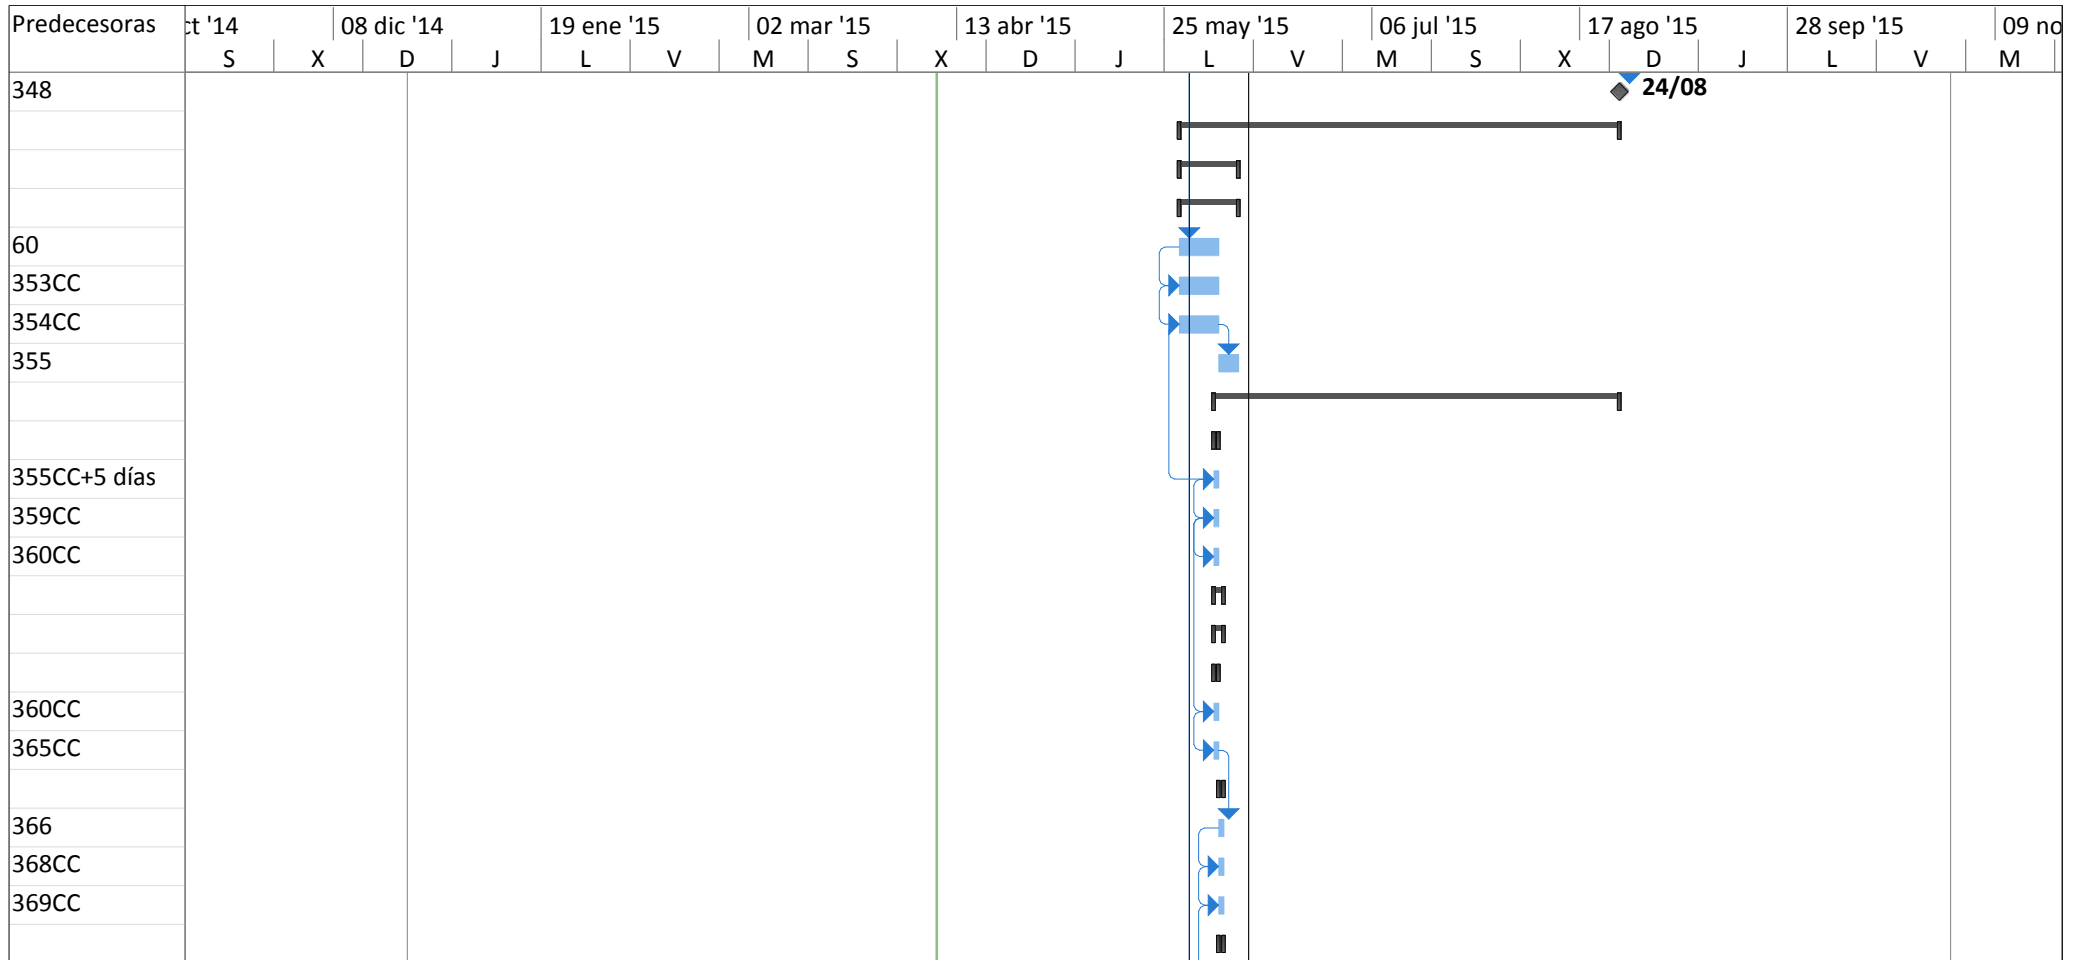

Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

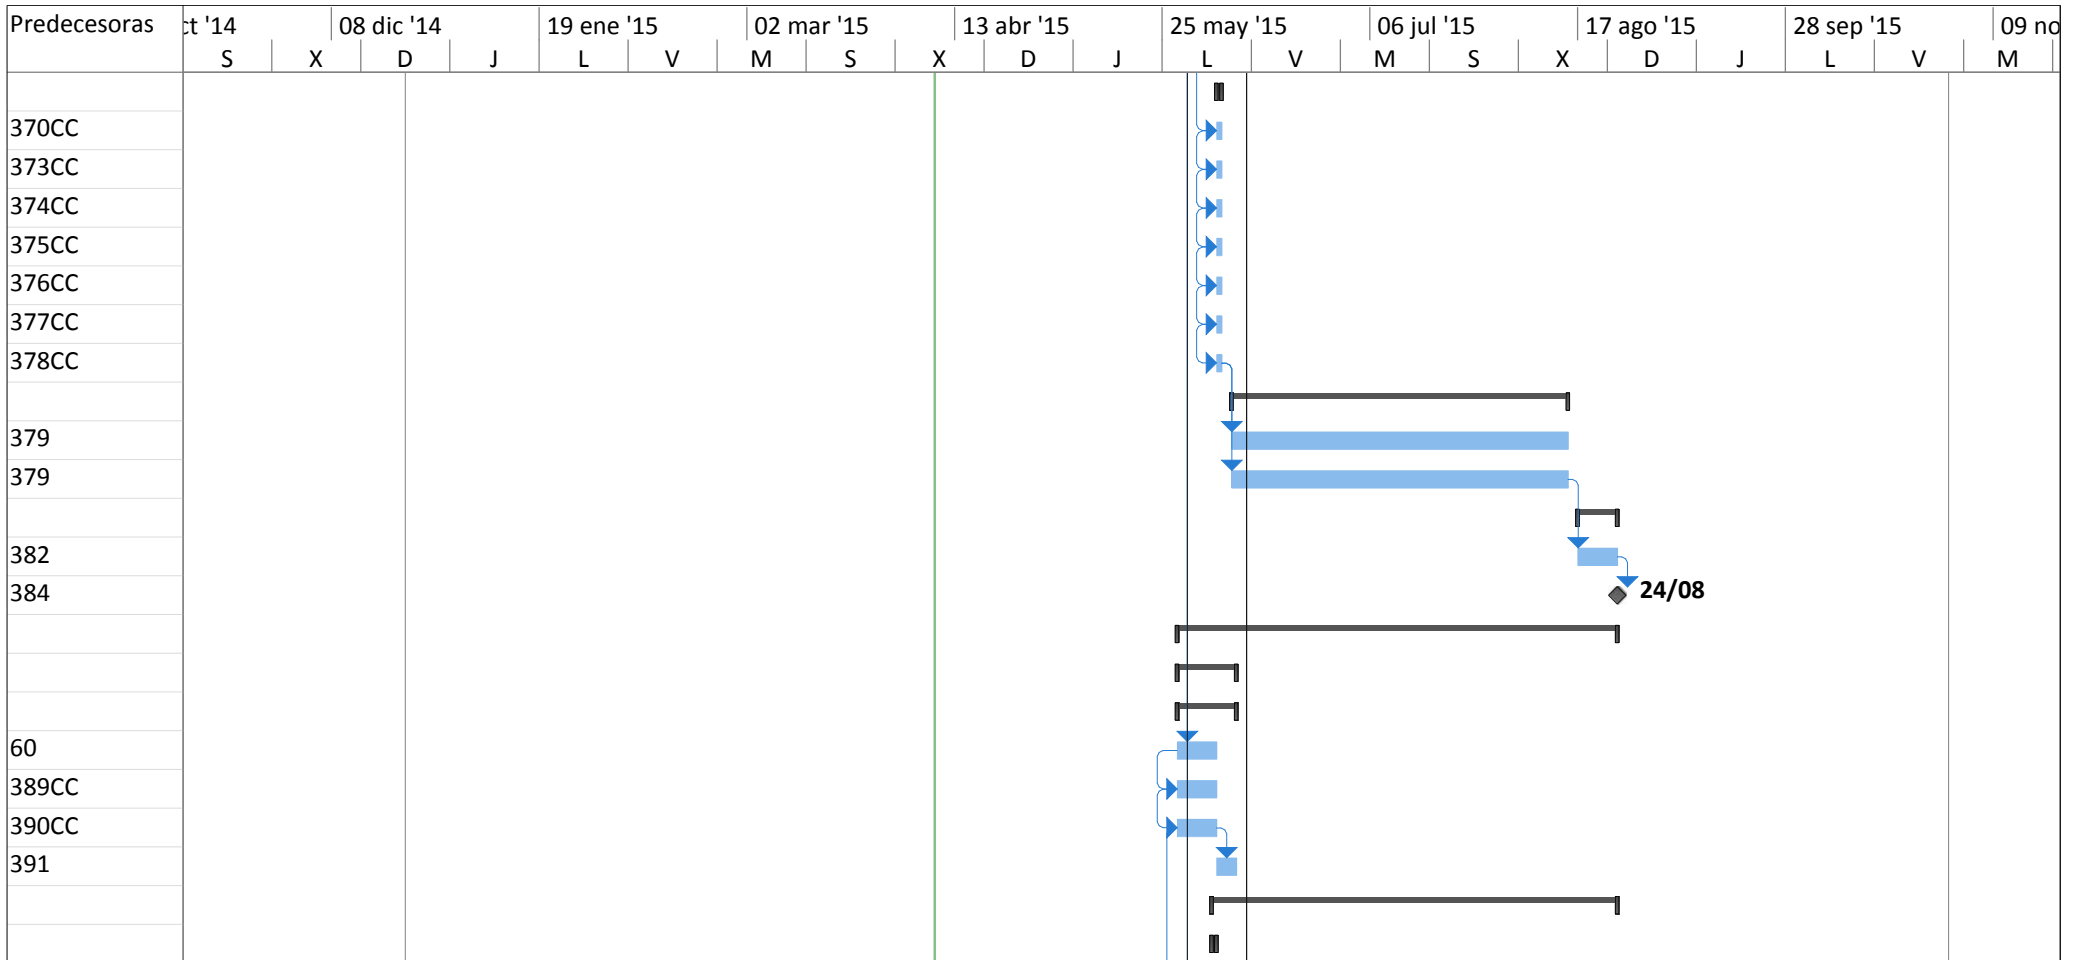


Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

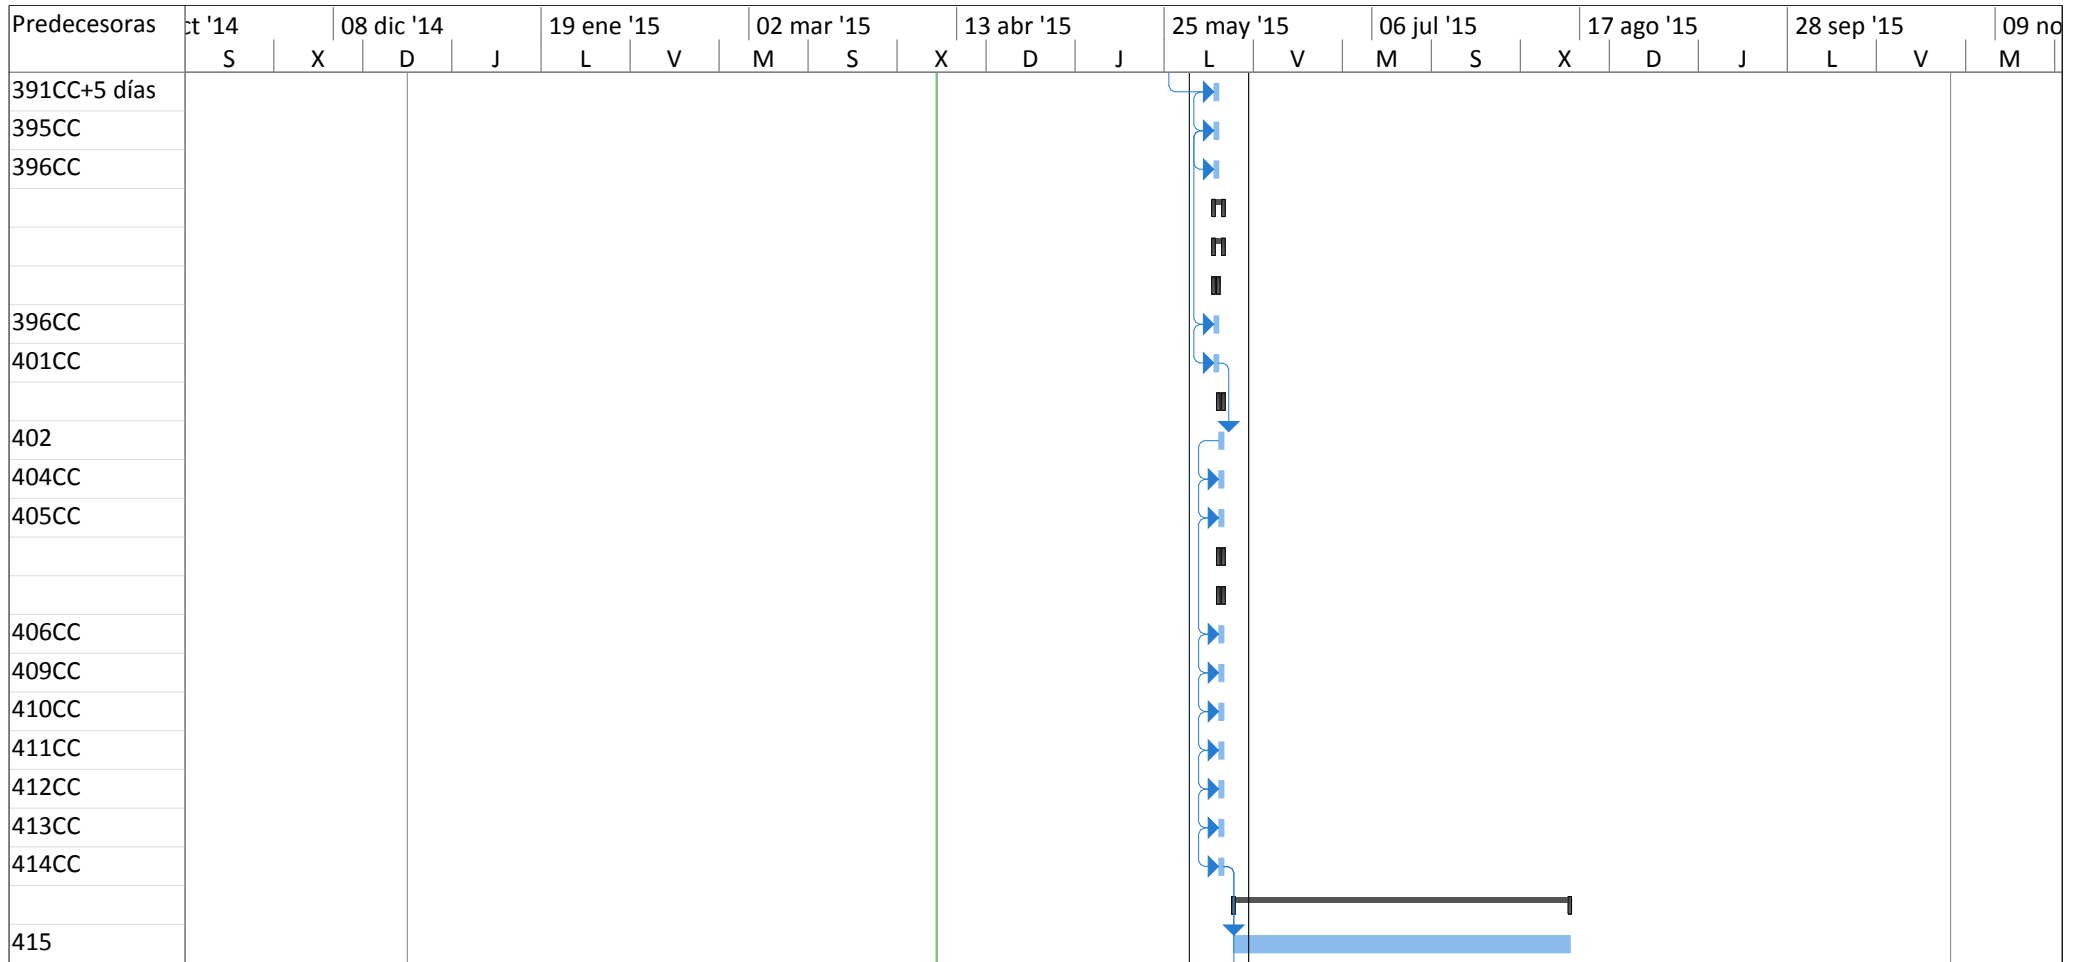


Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			



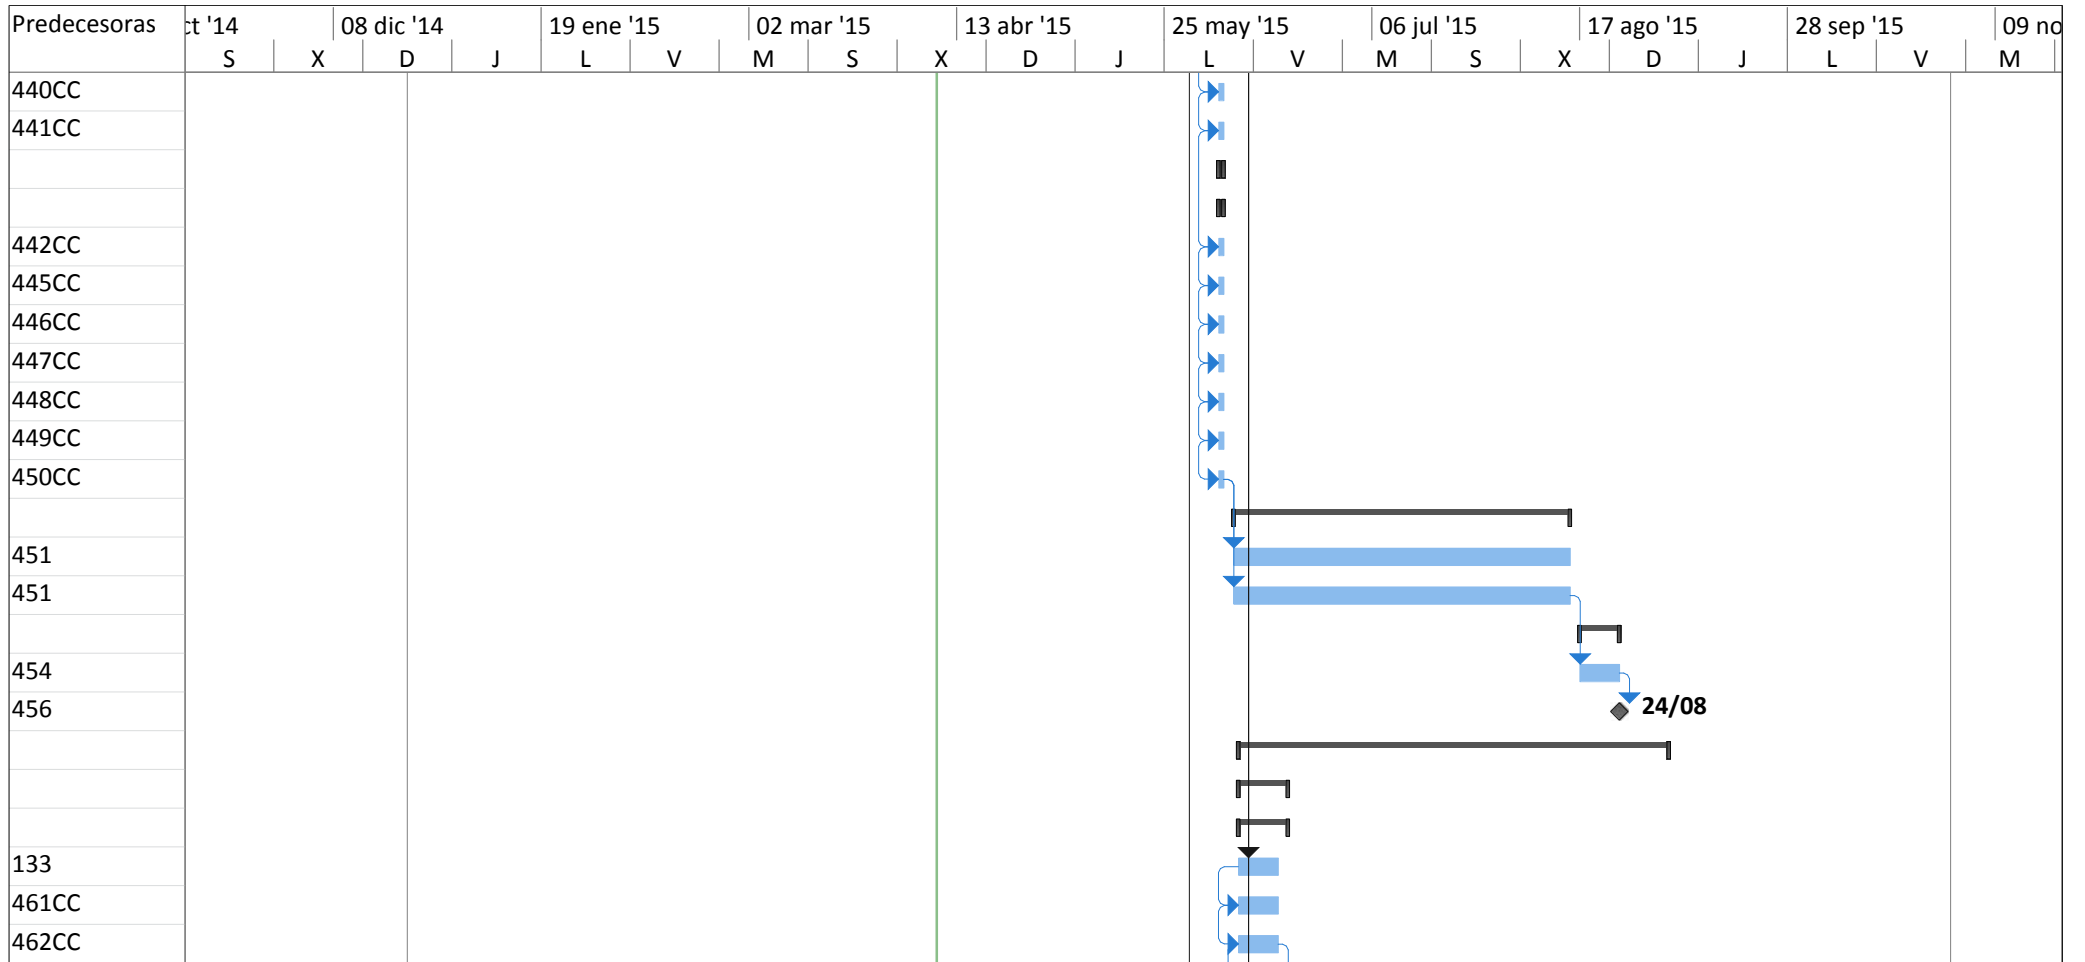


Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			




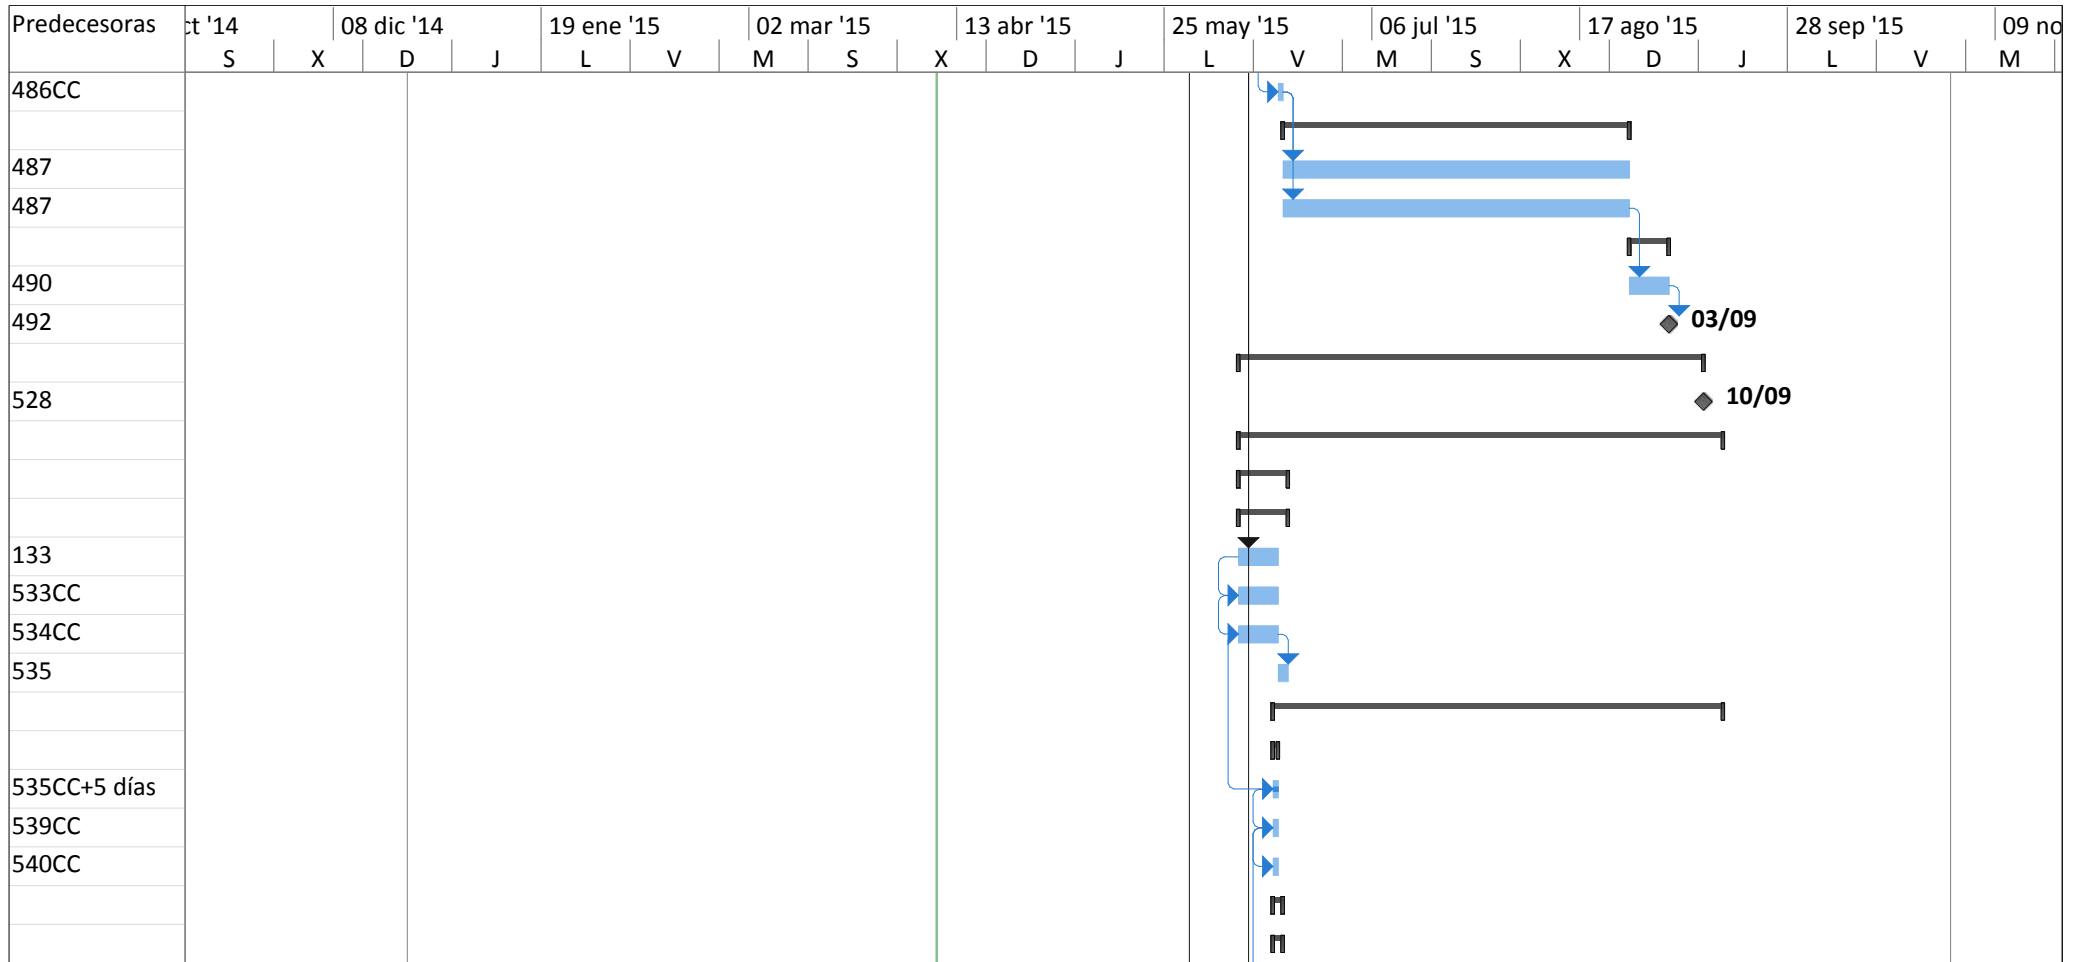


Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

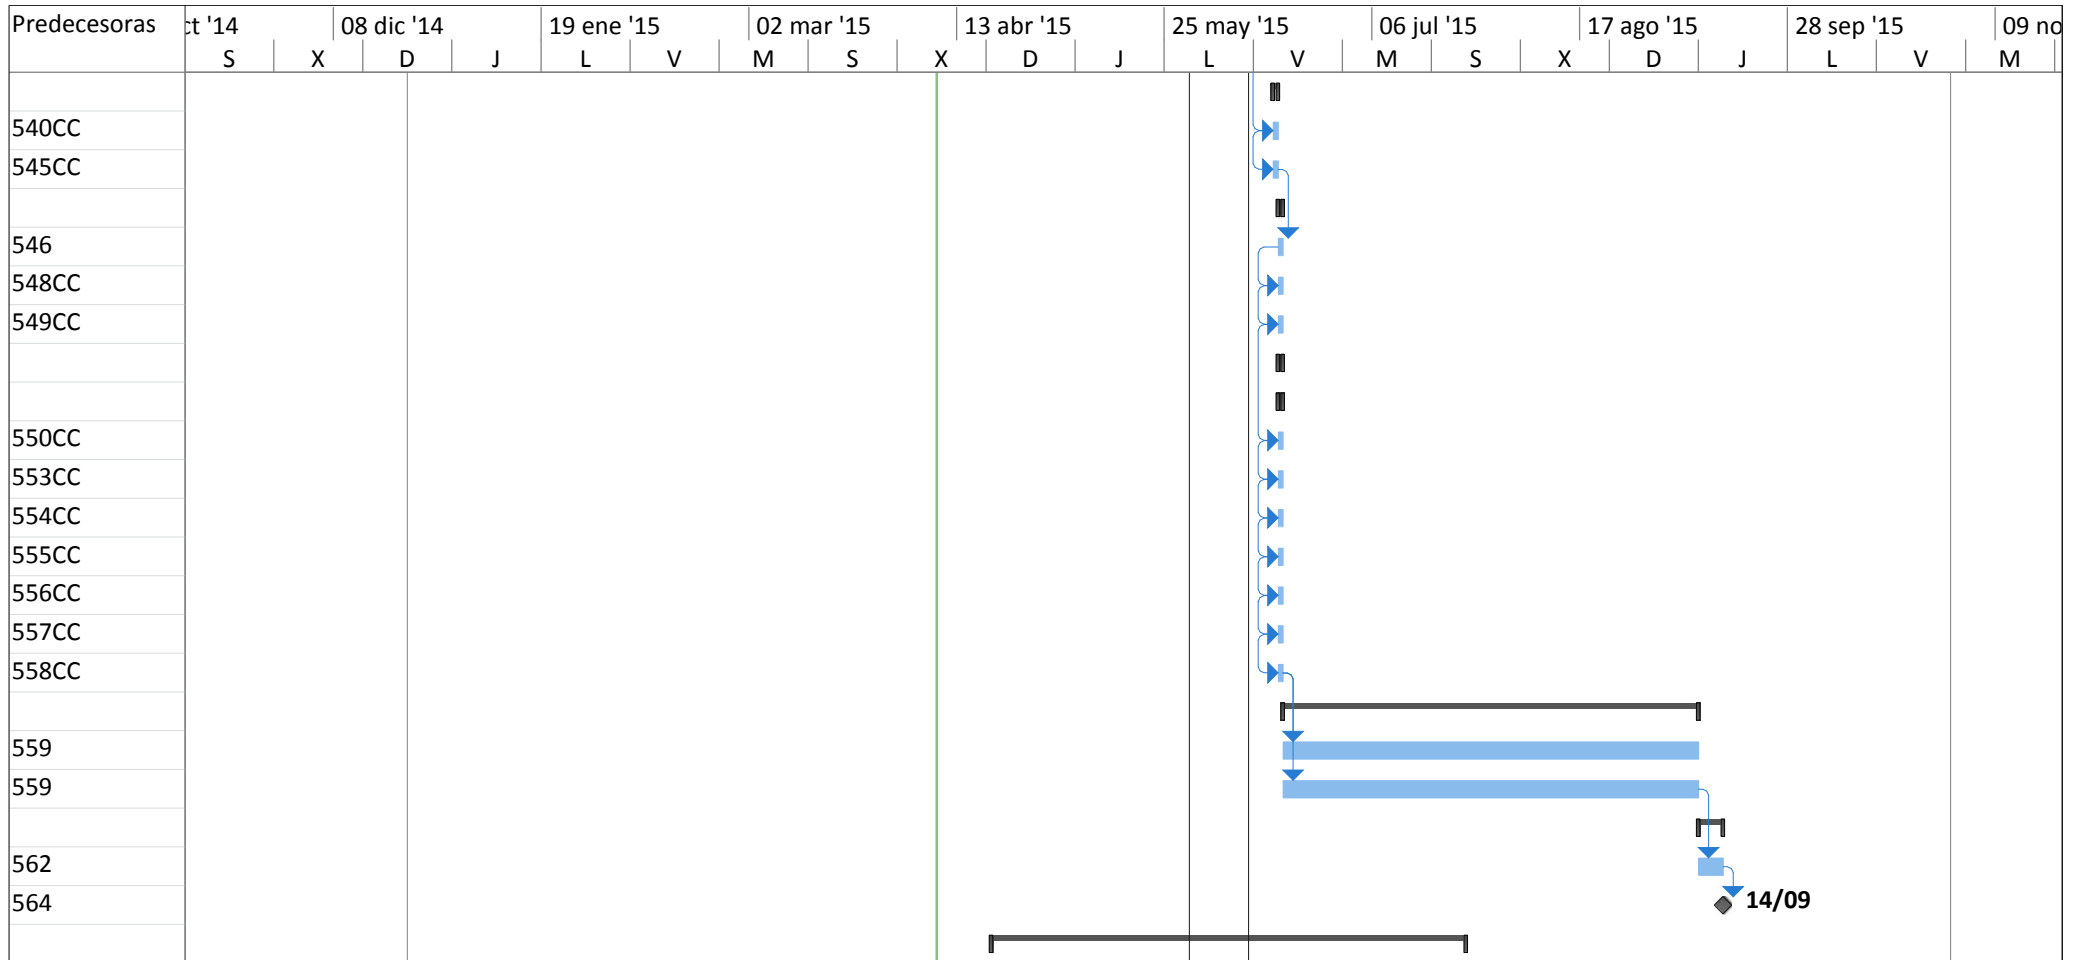


Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

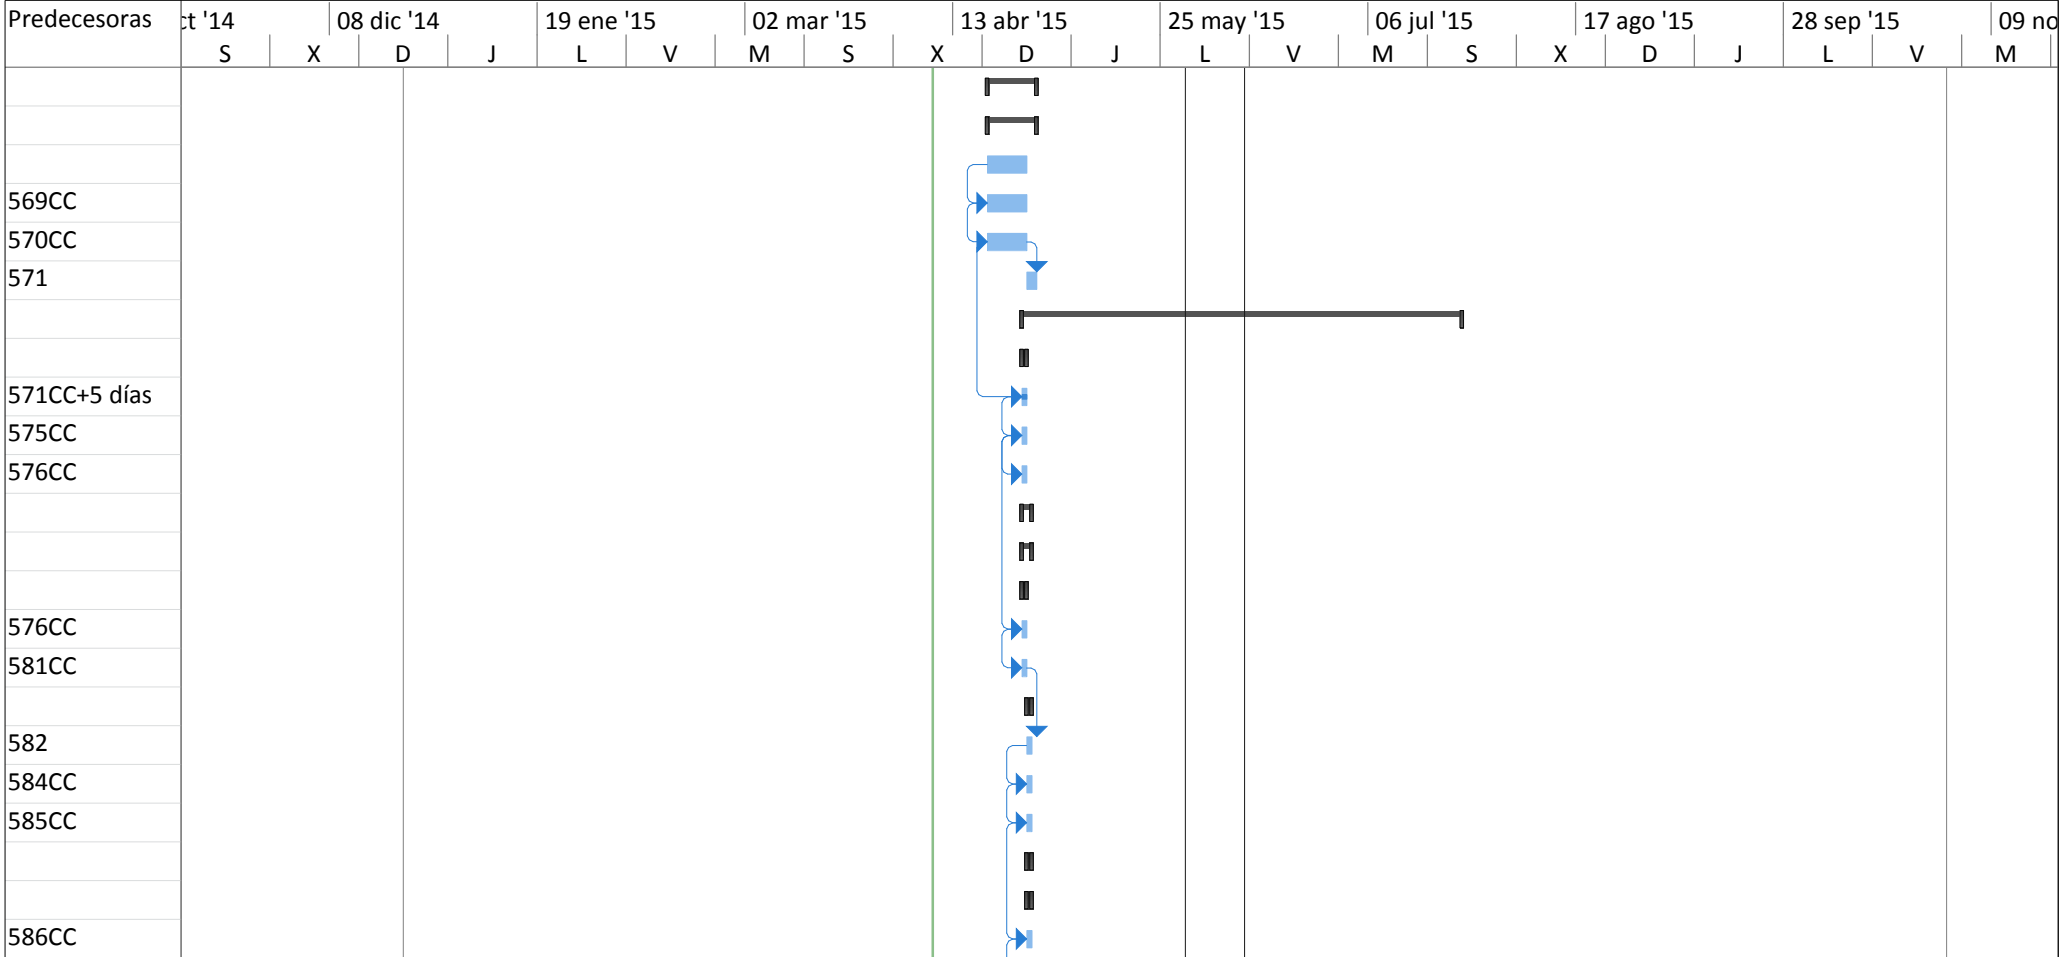


Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

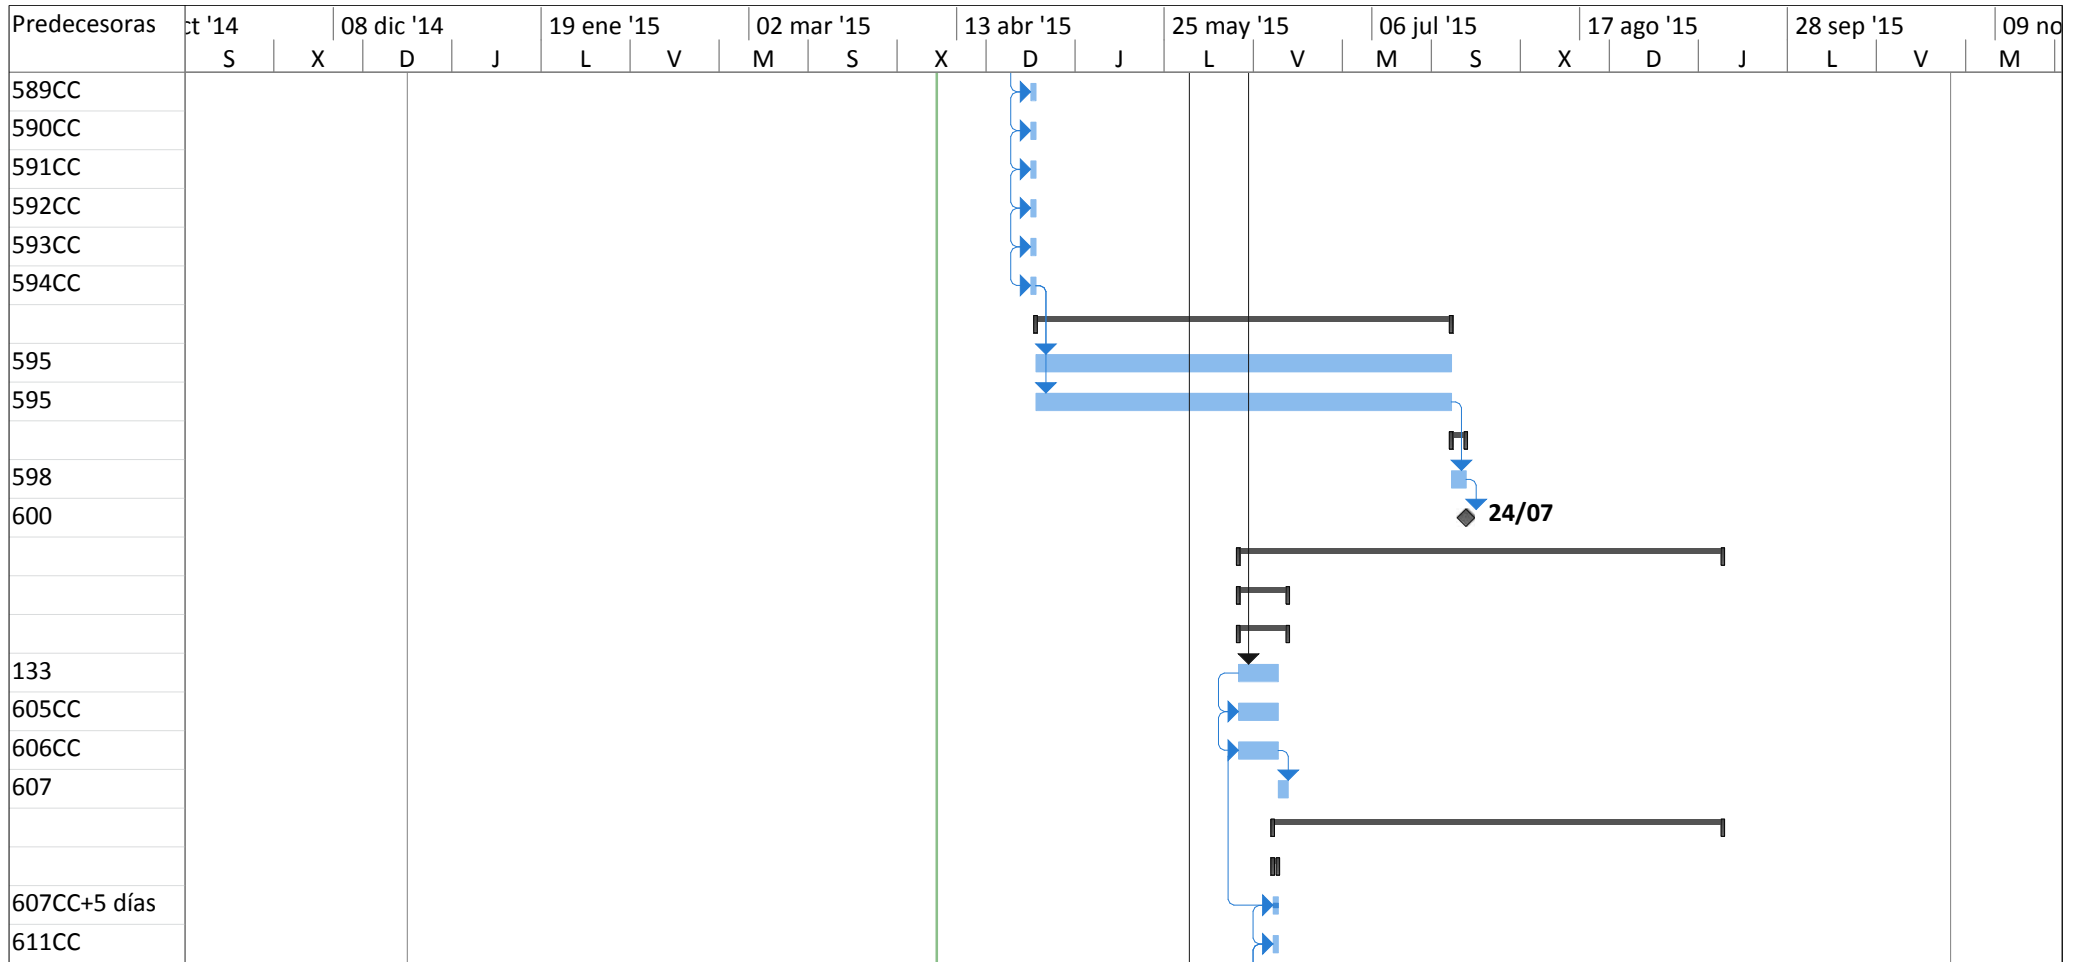


Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

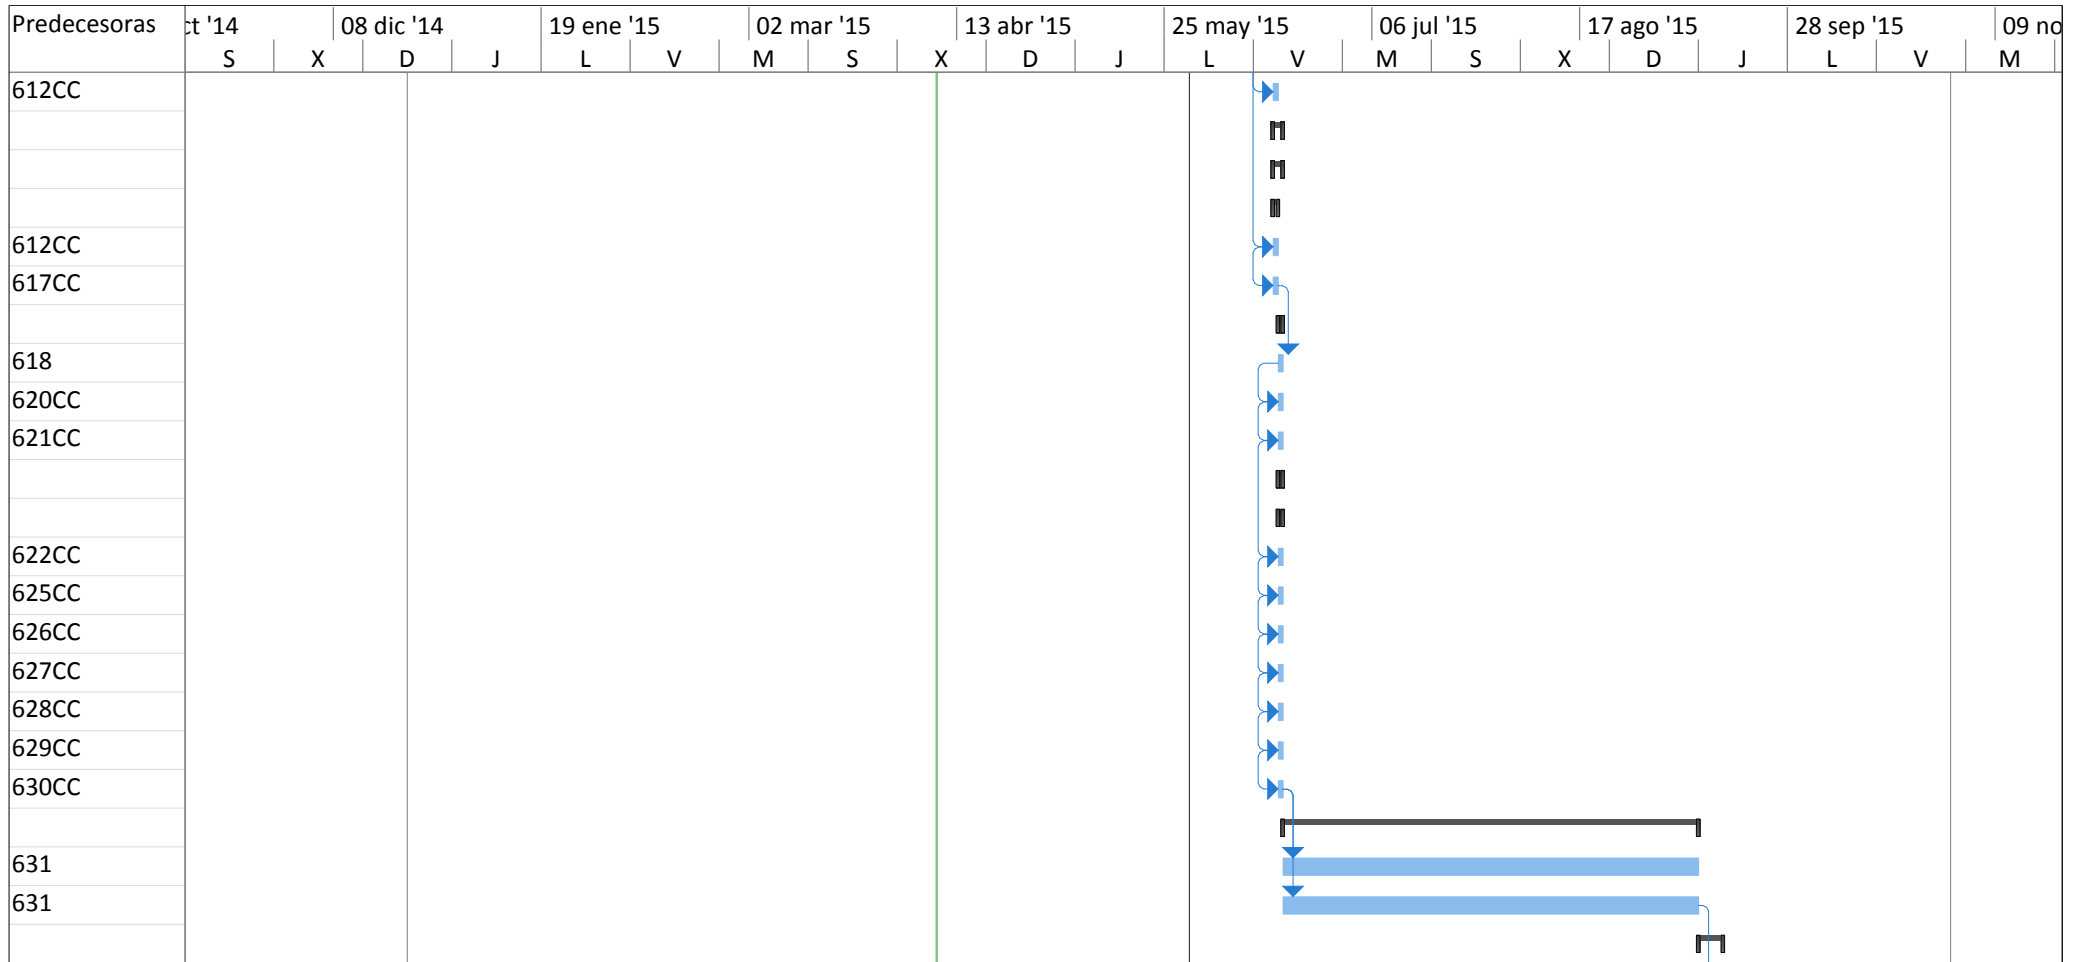

Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

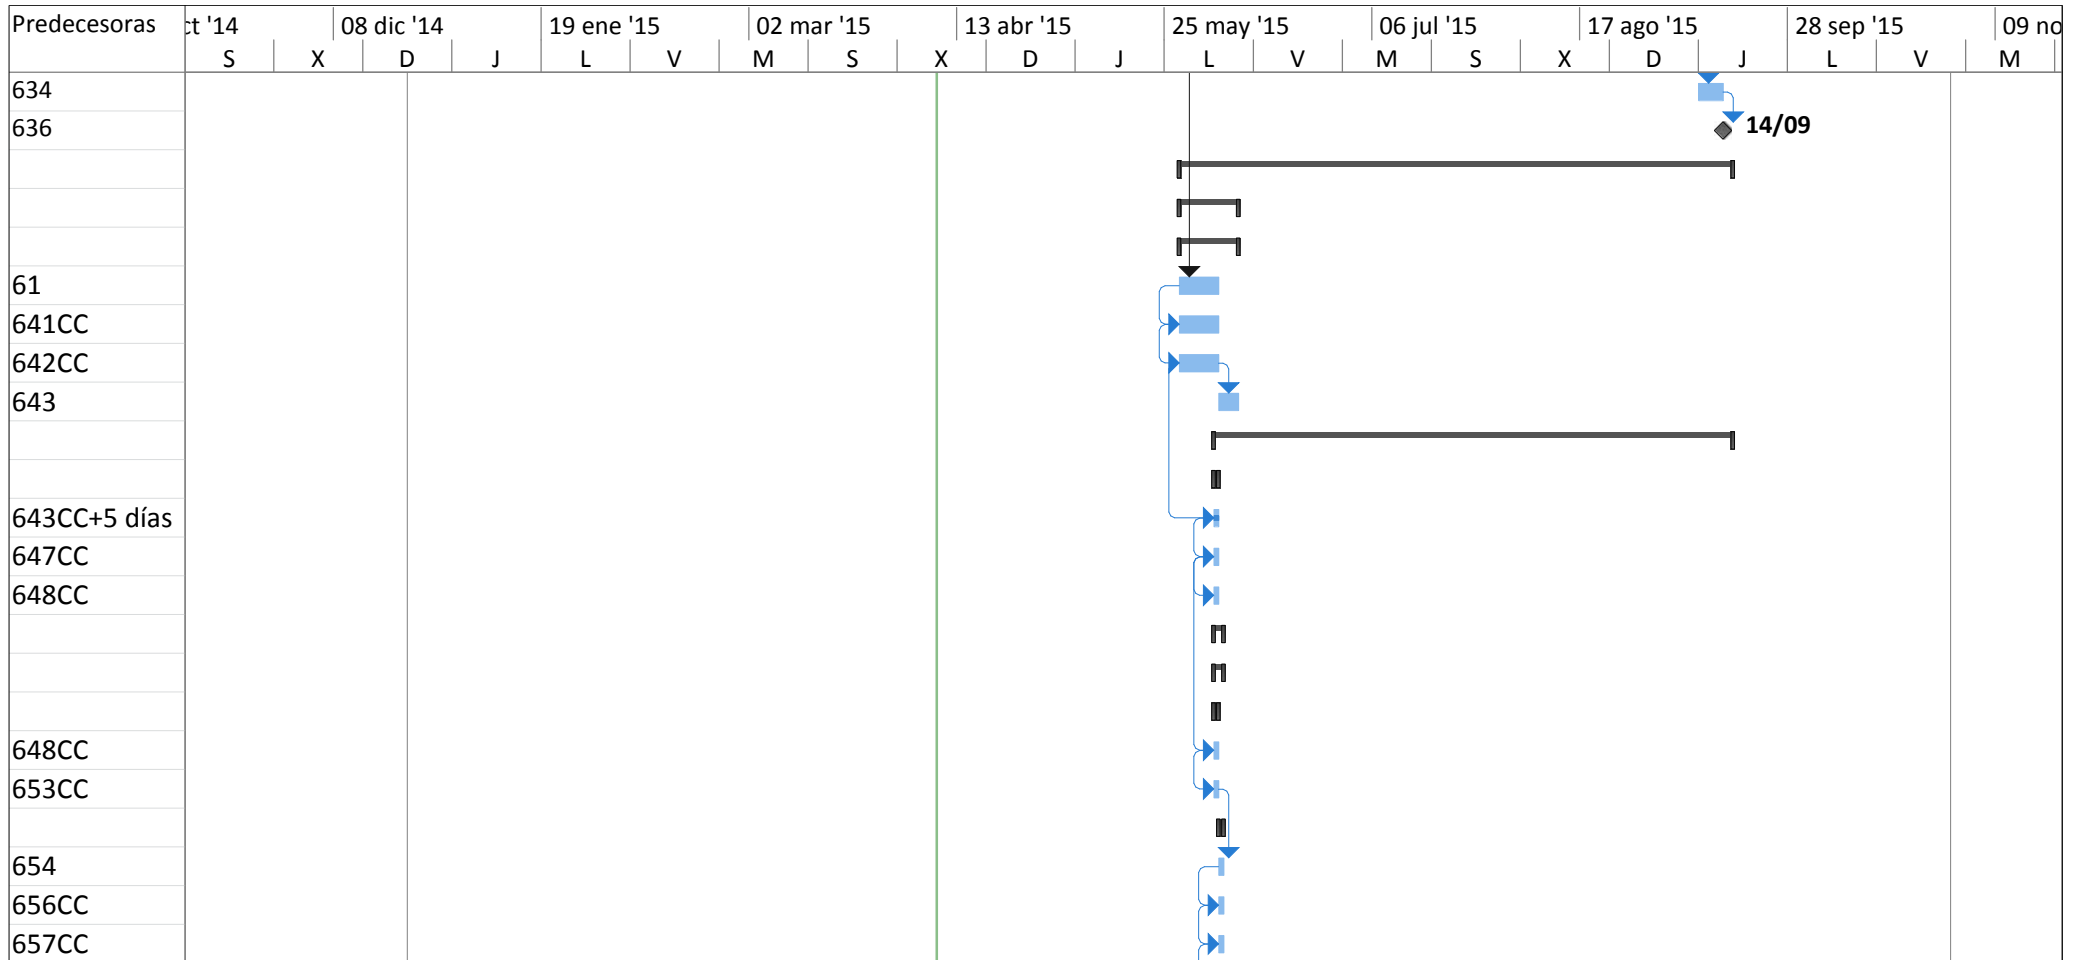

Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

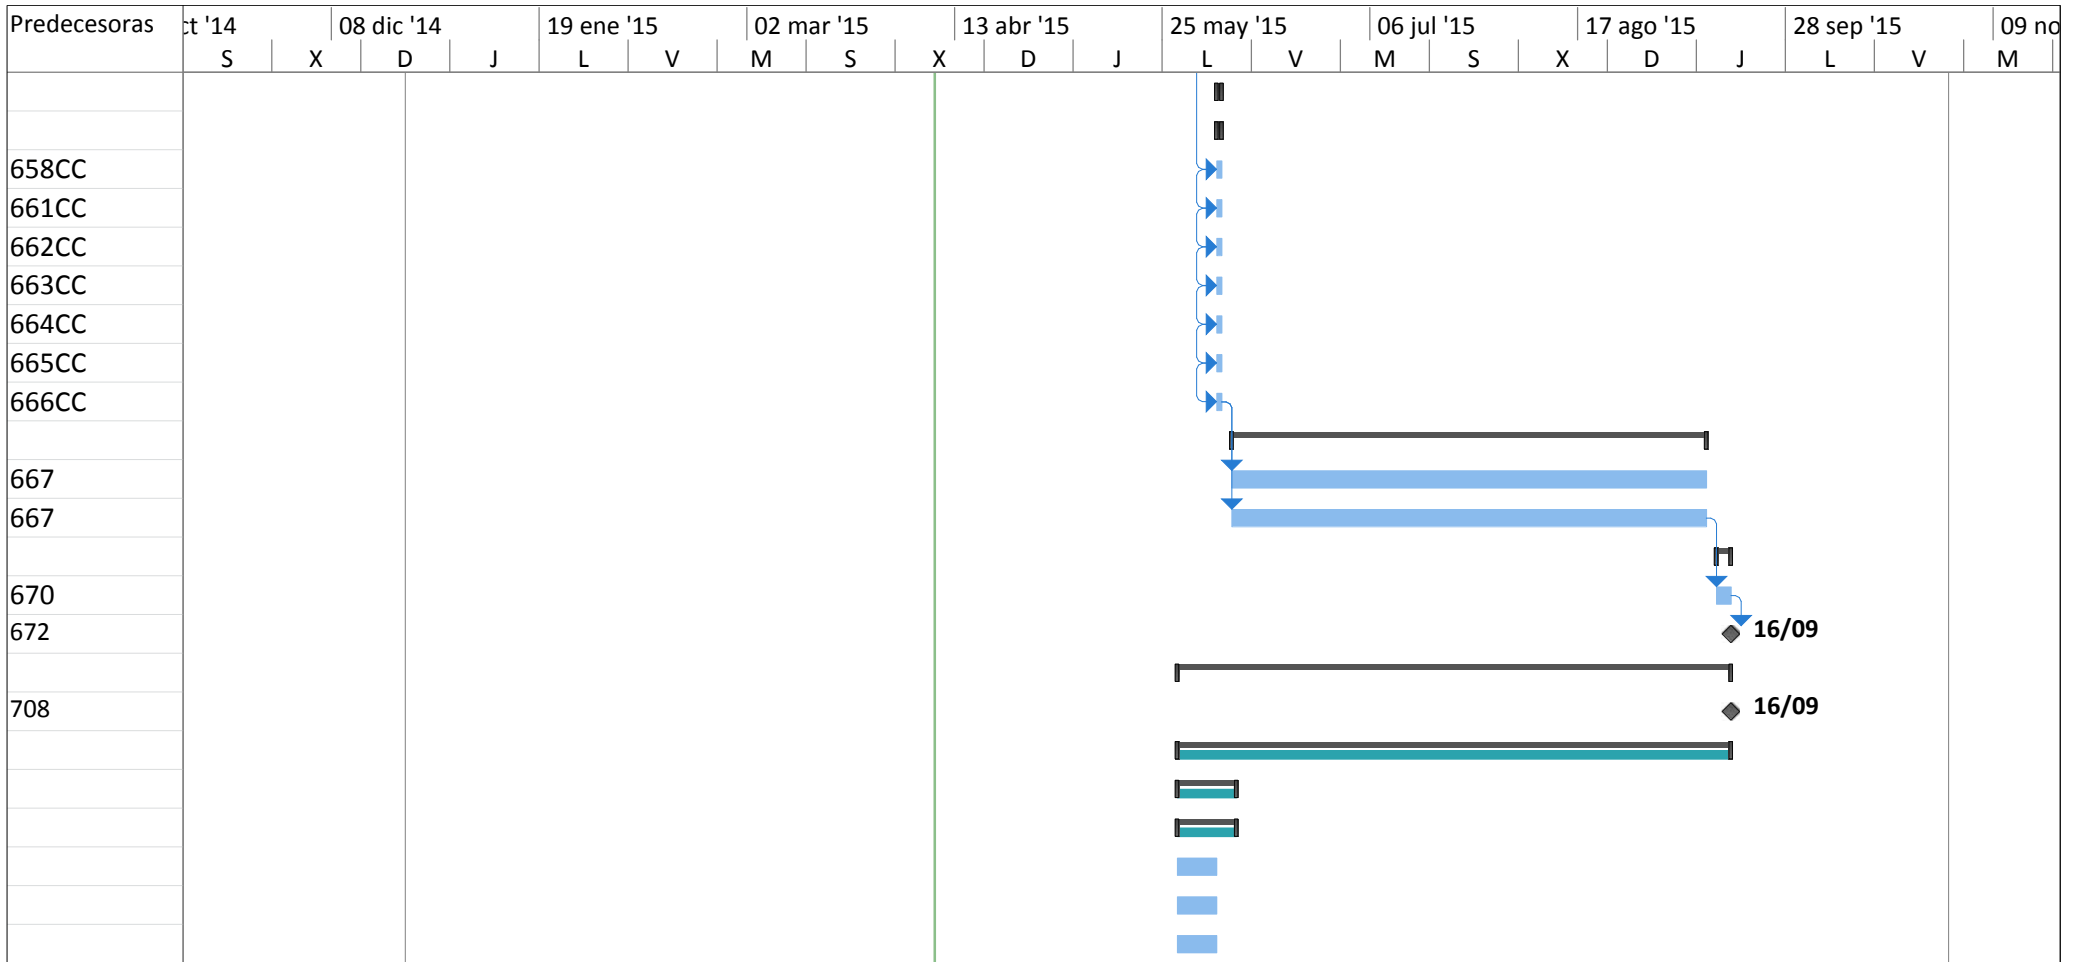

Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			





Predecesoras	01 dic '14		08 dic '14		19 ene '15		02 mar '15		13 abr '15		25 may '15		06 jul '15		17 ago '15		28 sep '15		09 oct '15		
	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M



Project: DAU v3 08_04_2015 Date: jue 09/04/15	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Progress	
	Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			
